次　第：

１０：３０	開会
	次第説明
	出席者紹介
１０：３５	工事進捗状況のご説明
１０：５０	自由提案施設（等々力球場西側）工事計画のご説明
１１：００	質疑応答
１１：３０	閉会

お願い：

- 会場内での録音・撮影はお控え下さい。
- 質疑応答の時間は工事計画説明の後に設けておりますので、説明の途中でのご発言につきましてはご遠慮ください。
- 上記時間は目安となります。会場の都合により、１１：３０には閉会いたします。
  閉会後のスムーズな退出にご協力ください。
- 本日の議事の正確な記録をとるために、ボイスレコーダーにて録音させていただきます。

等々力緑地再編整備・運営等事業
工事説明会次第

一、開会

一、事業者挨拶

一、工事計画のご説明

一、質疑応答

一、閉会

等々力緑地再編整備・運営等事業
工事説明会

2026年 9月 19日


事業者　川崎とどろきパーク株式会社

施工者　株式会社内藤ハウス 横浜支店

工事計画のご説明


今回説明会対象の工事について

等々力緑地再編整備・運営等事業　工事工程（予定）

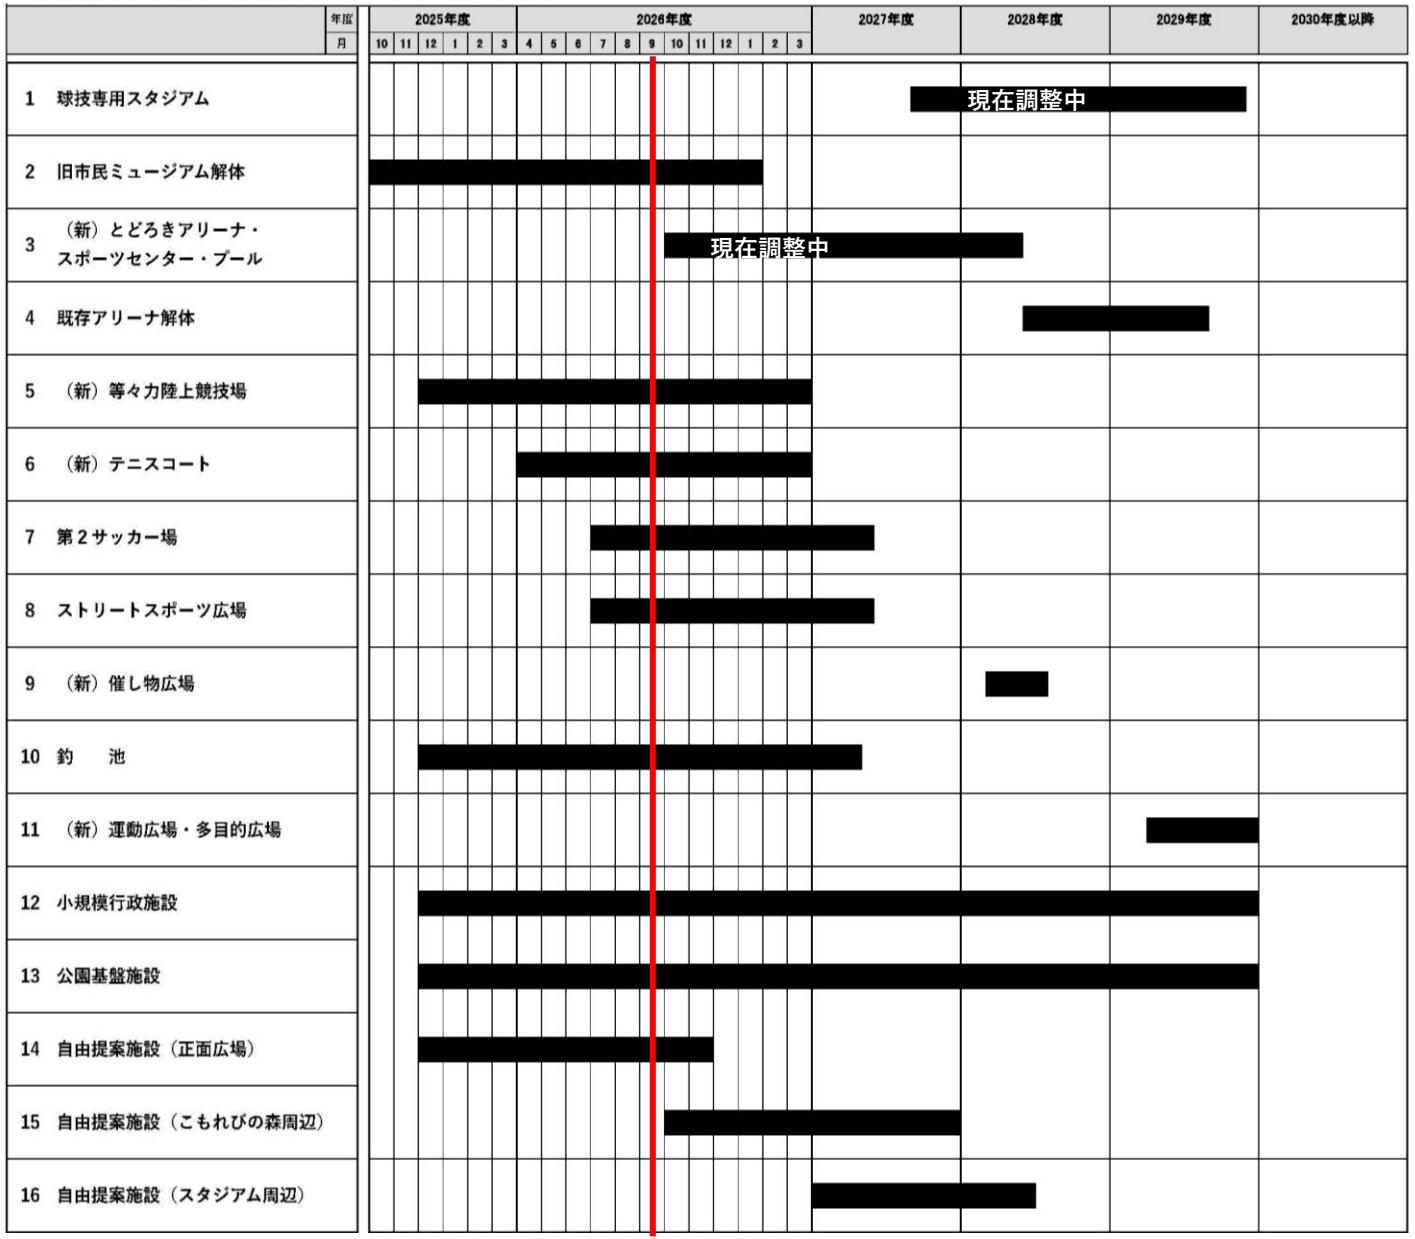

※工事工程は、2025年10月時点の想定であり、
今後の計画の深度化や行政協議等により
変更となる可能性があります。

今回説明会対象工事概要

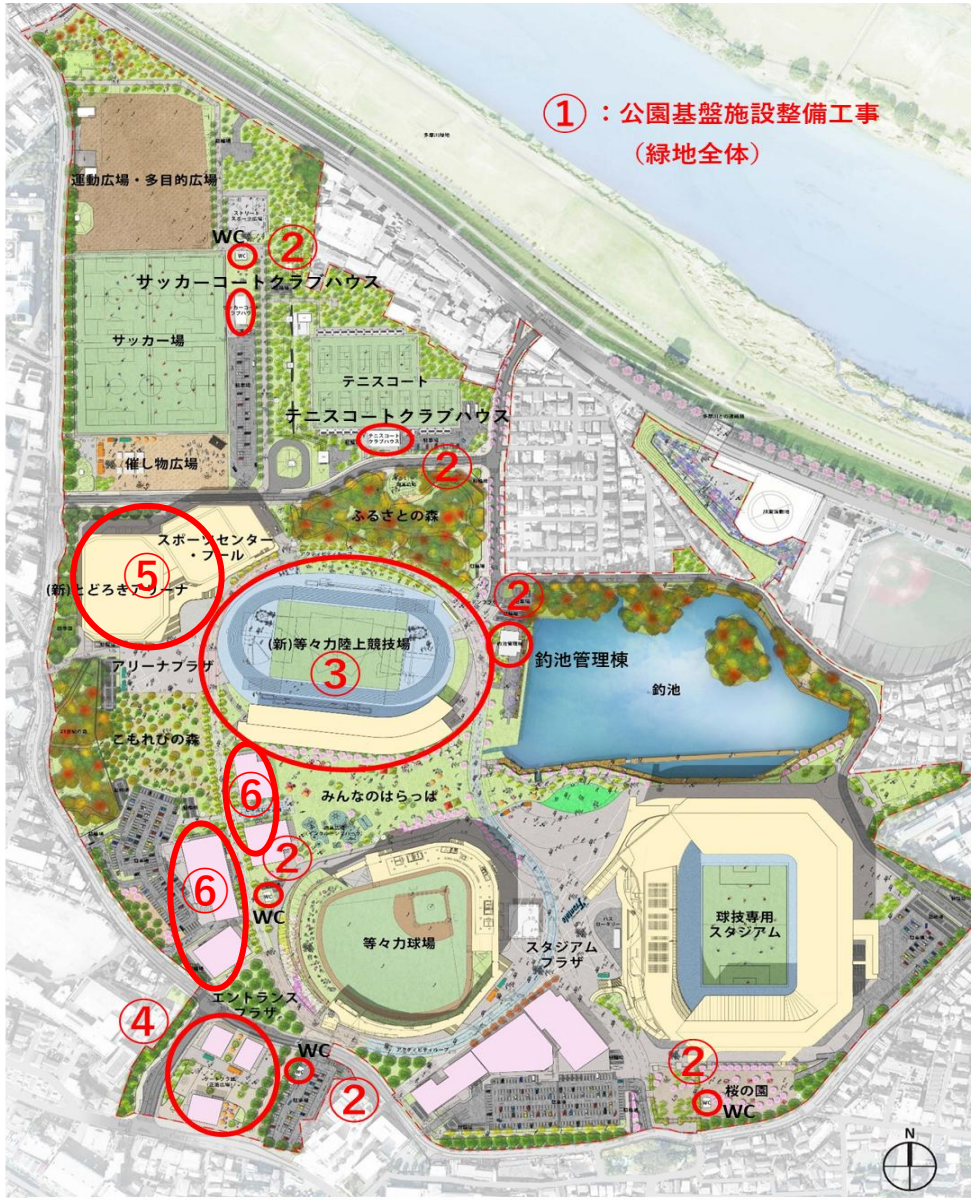

※計画内容は今後各種検討、各種行政協議等により変更の可能性があります。

① 公園基盤施設整備工事
施　工　者　　東急建設株式会社（土木）

② 小規模行政施設建設・解体工事
施　工　者　　東急建設株式会社（建築）

③ （新）等々力陸上競技場建設工事
施　工　者　　株式会社フジタ

④ 自由提案施設建設工事（正面広場）
施　工　者　　株式会社大山組

⑤ 旧川崎市市民ミュージアム解体工事
施　工　者　　大成建設株式会社

⑥ 自由提案施設建設工事（球場西側）
施 工 者　　株式会社内藤ハウス
※10月から新たに着工する工事の施工者

工事の大まかな流れ

工事の大まかな流れ



ステップ1
２０２６年９月現況

○工事を実施している主な施設


- 旧市民ミュージアム解体
- （新）とどろきアリーナ・スポーツセンター・プール
- （新）等々力陸上競技場
- 釣池
- 公園基盤施設
- 自由提案施設（正面広場）
- 自由提案施設（こもれびの森周辺）
- 自由提案施設（スタジアム周辺）

自動車　通行可能経路

人・自転車通行可能経路

※時期等は現時点での想定であり、変更となる可能性があります。

工事の大まかな流れ

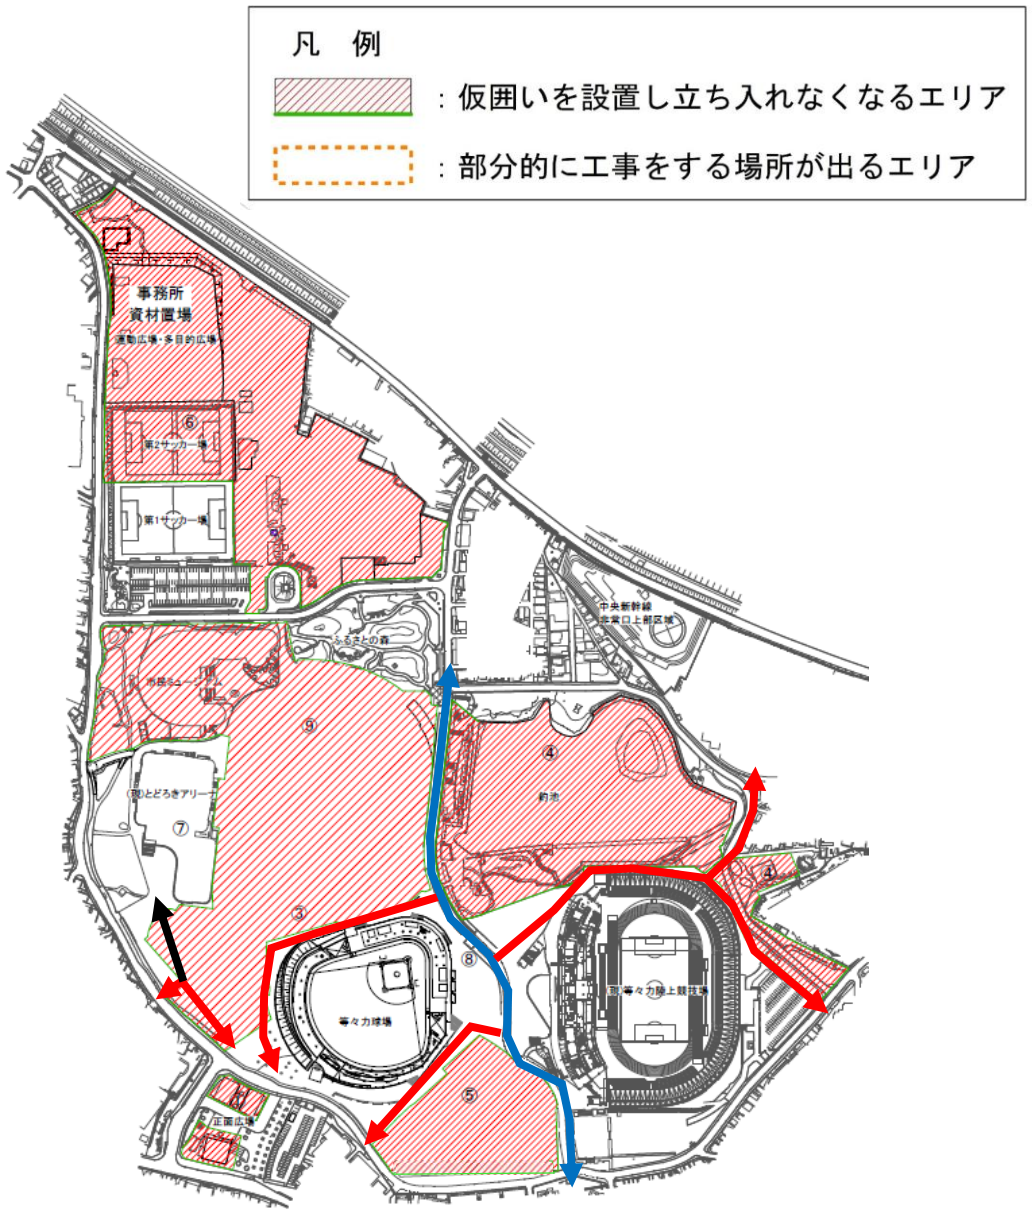

※時期等は現時点での想定であり、変更となる可能性があります。

ステップ２
２０２６年１０月頃

○工事を実施している主な施設


- 旧市民ミュージアム解体
- （新）とどろきアリーナ・スポーツセンター・プール
- （新）等々力陸上競技場
- 釣池
- 公園基盤施設
- 自由提案施設（正面広場）
- 自由提案施設（こもれびの森周辺）
- 自由提案施設（スタジアム周辺）

⟷ 自動車　通行可能経路

⟷ 人・自転車通行可能経路

⟷ 人　アリーナイベント時のみ通行可能経路

工事の大まかな流れ

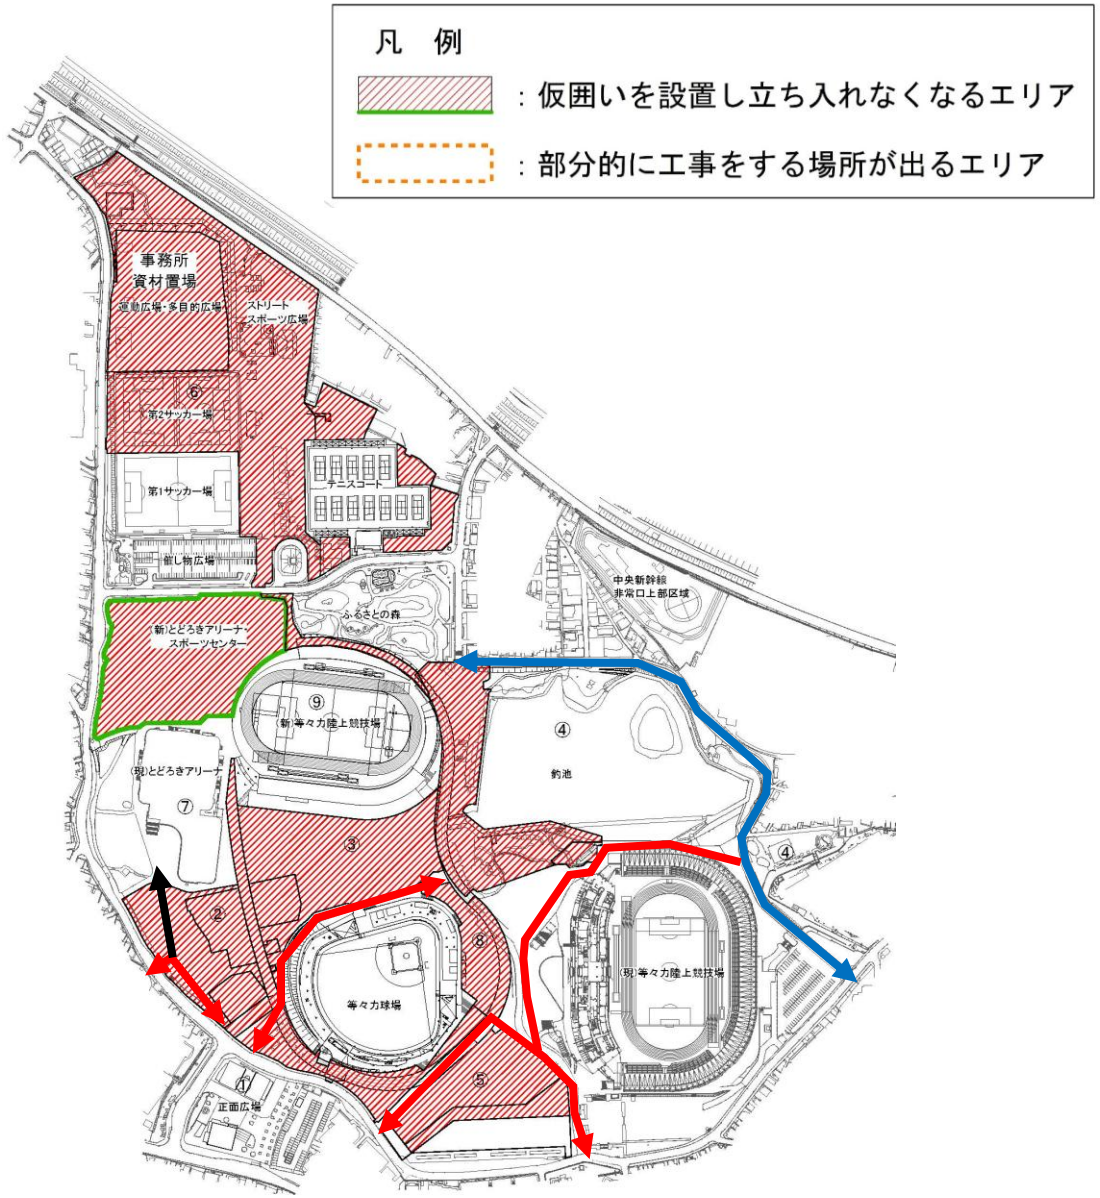

ステップ３
２０２７年6月頃

○工事を実施している主な施設

- 球技専用スタジアム
- （新）とどろきアリーナ・スポーツセンター・プール
- 公園基盤施設
- 自由提案施設（こもれびの森周辺）
- 自由提案施設（スタジアム周辺）


自動車　通行可能経路

人・自転車通行可能経路

人　アリーナイベント時のみ通行可能経路

※時期等は現時点での想定であり、変更となる可能性があります。

工事の大まかな流れ

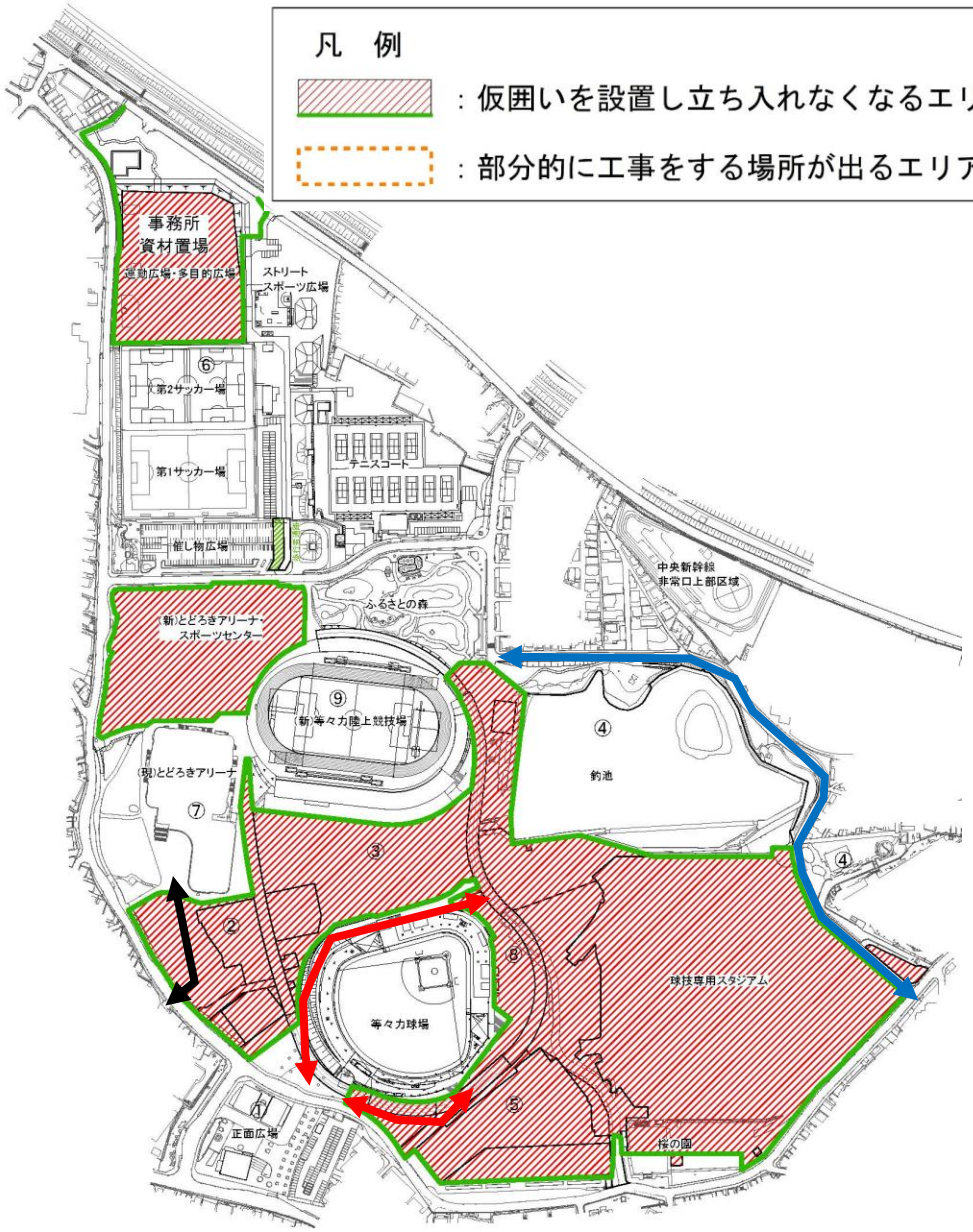

ステップ4
２０２７年１２月頃

○工事を実施している主な施設

- 球技専用スタジアム
- （新）とどろきアリーナ・スポーツセンター・プール
- 公園基盤施設
- 自由提案施設（こもれびの森周辺）
- 自由提案施設（スタジアム周辺）

自動車　通行可能経路

人・自転車通行可能経路

人　アリーナイベント時のみ通行可能経路

※時期等は現時点での想定であり、変更となる可能性があります。

工事の大まかな流れ



ステップ5
２０２８年６月頃

○工事を実施している主な施設


- **球技専用スタジアム**
- **既存アリーナ解体**
- **公園基盤施設**

自動車通行可能経路

人・自転車通行可能経路

※時期等は現時点での想定であり、変更となる可能性があります。

工事の大まかな流れ

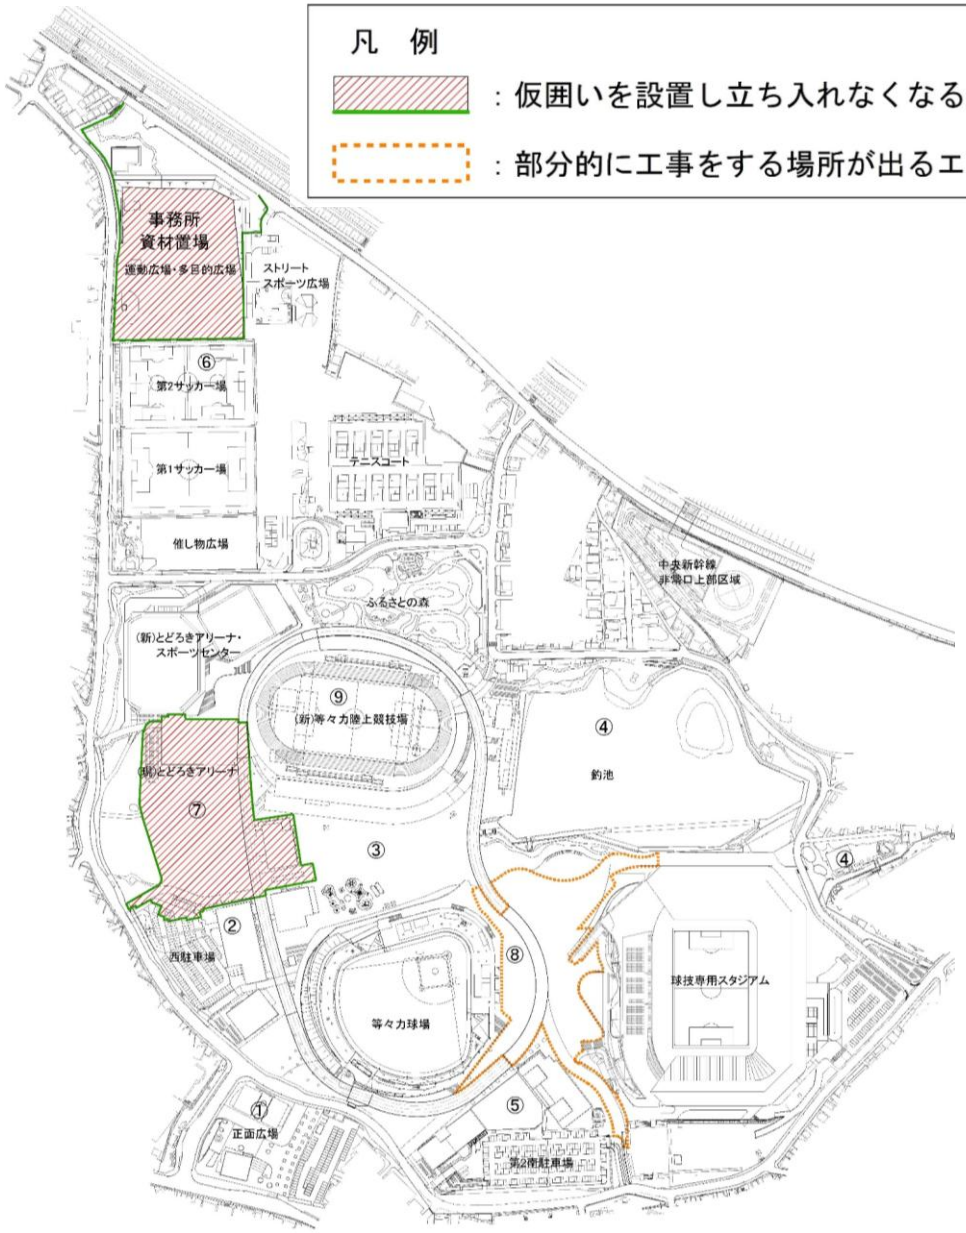

ステップ6
２０３０年３月頃

○工事を実施している主な施設

- **（新）運動広場・多目的広場**
- **公園基盤施設（こもれびの森周辺）**

※時期等は現時点での想定であり、変更となる可能性があります。

施設利用休止

【重要】
等々力緑地再編整備開始に伴う
各施設利用休止期間のお知らせ
（3/12時点）

※赤字の部分が変更・追記となります。

施設名称	利用休止期間
運動広場	2025年12月　1日(月)　～　2030年　4月（予定）
多目的広場	2025年12月15日(月)　～　2030年　4月（予定）
釣池	2025年12月　1日(月)　～　2027年　8月（予定）
第1サッカー場	2026年　6月15日(月)　～　2027年　9月（予定） ※第1サッカー場（人工芝）につきましては、安全面に十分配慮した上で、特別措置として、川崎市認定の「日程調整会議認定団体」に限り、利用休止期間中の継続使用を認めるものといたします。
第2サッカー場	2026年　6月15日(月)　～　2027年　9月（予定）
補助競技場 ⇒(新)陸上競技場	2025年12月　1日(月)　～　2027年　5月　5日（予定）
テニスコート	2026年　9月24日(木)　～　2027年　4月（予定）

※上記の利用休止期間につきましては、工事の進捗状況等により変更となる場合がございます。
何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
※その他の施設につきましては、令和8年度以降、準備が整い次第、順次ご案内いたします。


歩道一部う回のお願い


9月30日(水)～10月16日(金)
歩道一部う回のお願い

等々力緑地再編整備工事の進捗に伴い、中央園路の一部で水道の切替工事を行います。下記日程にて、歩道から車道にう回をお願いいたします。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。


日時：
9月30日(水)～10月16日(金)
のうち平日９時～１７時

右図水色範囲 の通り、一部車道へう回をお願いします。
車道と歩道の段差部はスロープとし、誘導員を配置し、安全を確保いたします。

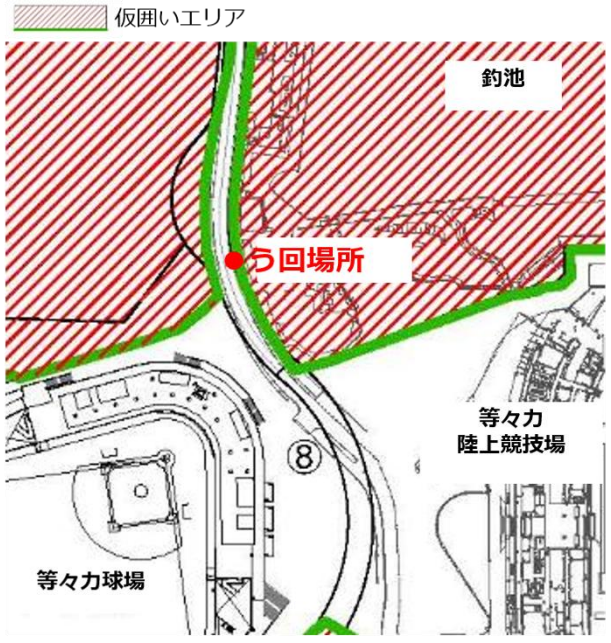

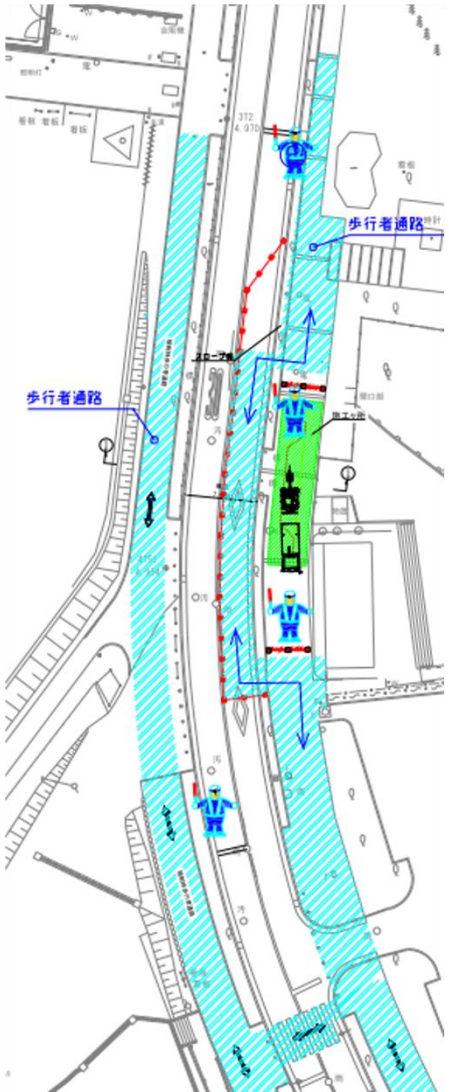

配置図兼車両動線図

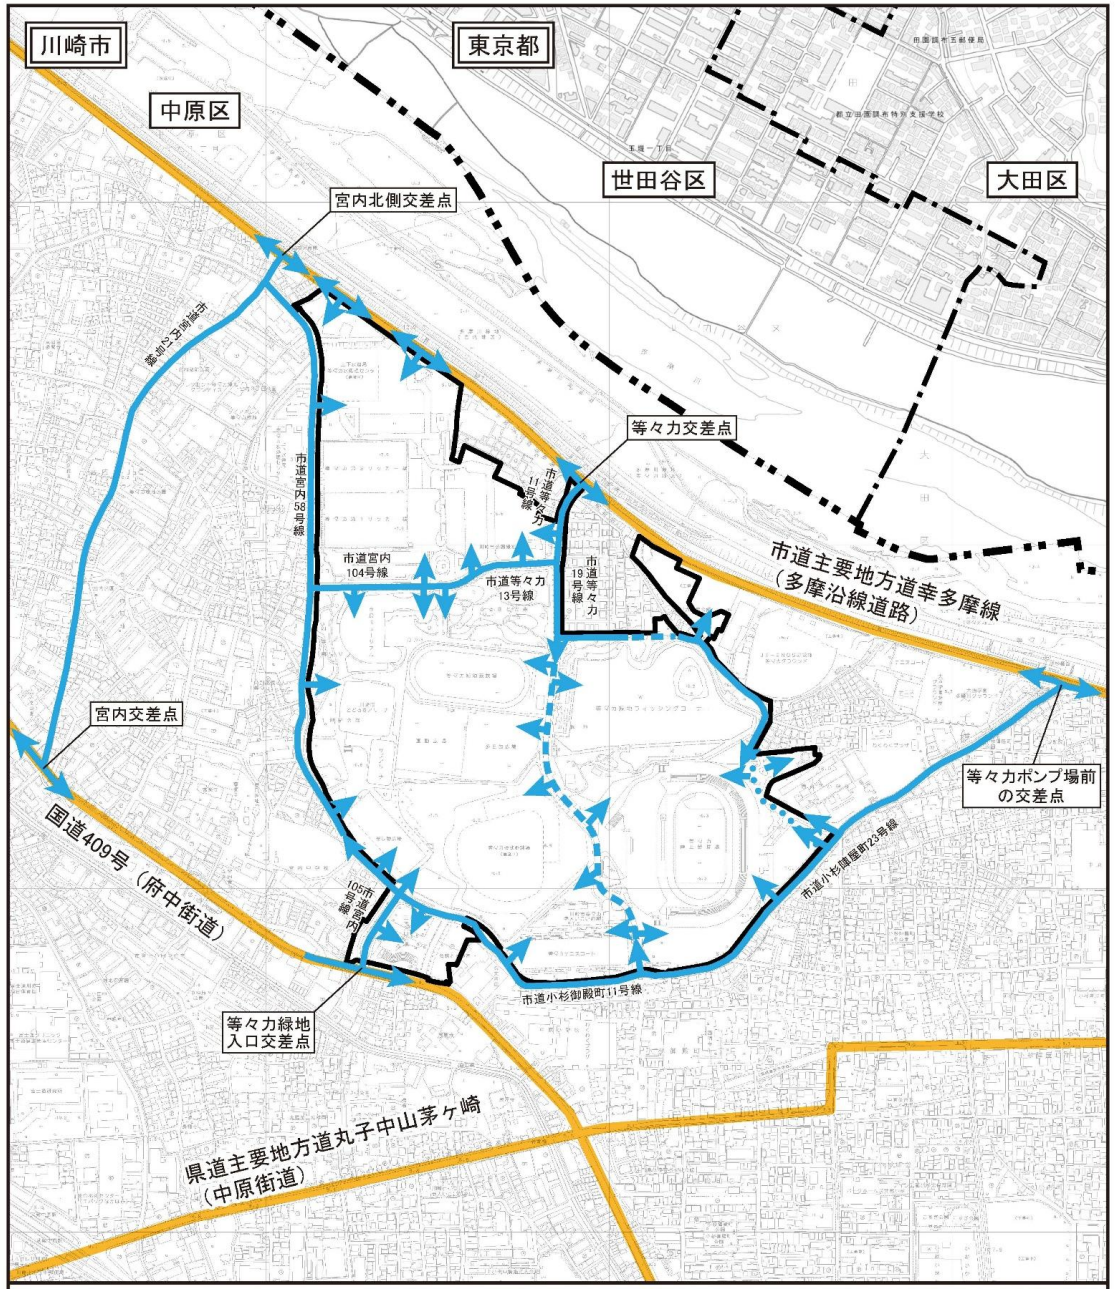

凡 例

この地図は「国土地理院地図」及び「川崎市地形図_1/2,500_PDF形式（川崎市）」（平成31年度）を加工して作成したものである。

- 計画地
- 都県界
- 区　界
- 幹線道路
- 工事用車両走行ルート（公道）
- 工事用車両走行ルート（園路）
- 工事用車両走行ルート（将来の園路）

注）今後の検討・協議等により、変更となる可能性があります。

0　100　200　300　400　500m

N

（参考資料）車両掲示イメージ



※裏面に運転者に対する注意事項等を記載して周知を促します。
　また関係施工者の連絡先も記載し、緊急時の連絡に不備がないように致します。

工事施工について

１.作業日・作業時間について

現場作業は、原則として、月曜日から金曜日までの8:00～18:00とし、
その前後1時間を準備、片付けなどの予備時間とします。
以下作業については上記作業日・時間を延長・変更する場合もあります。

- 安全確保上、作業当日の予定を途中で中断できない作業及び足場の組立、解体作業、コンクリートの打設作業等
- 道路交通法等の規制により時間の制約がある機材の搬出入作業
- 暴風雨、地震等の自然災害時において、安全維持のために必要とされる緊急作業
- 諸官庁の指導により作業日時を指定された作業

２.騒音・振動の防止について

騒音・振動を伴う作業に際しては、関係法令で定められた規制基準を守るとともに、
騒音・振動抑制を考慮した使用機械および工法を選定し、かつ、設置場所および
使用方法に十分留意します。

工事施工について

３.安全設備について

敷地周囲には仮囲を設置すると共に、必要に応じて、解体建物にはシート囲いや防護柵等を設置し、塵埃の飛散防止および落下物の防止に万全を期します。
また、消火設備の設置等、火災に対する予防策を講じ、火災の防止にも万全を期します。

４.工事用車両について

作業車両の通行時間は7:00～18:30の予定とします。通行に際しては、所轄警察署の指示・指導に従い、標識設置および誘導員配置により交通整理を適切に行います。
また、常に現場周囲の清掃を実施し、道路汚損を防止します。

５.作業員の管理について

責任をもって作業員の管理運営を行い、風紀を維持します。

６. 現場(工事)イメージアップの取組を推進します。

尚、上記以外の問題が生じた時は、その都度誠意をもって協議し、その解決に努力いたします。


① 公園基盤施設整備工事

施　工　者　　東急建設株式会社（土木）

工事概要


施　　工　　者	東急建設株式会社
整　備　施　設	釣池、広場、園路、ランニングコース、植栽、駐車場、 外周道路、第二サッカー場、テニスコート その他公園施設（ベンチ等） 雨水汚水排水設備・給水設備・ガス設備・電気通信設備
整　備　期　間	2025年12月1日～2030年3月31日（予定）

工事予定表

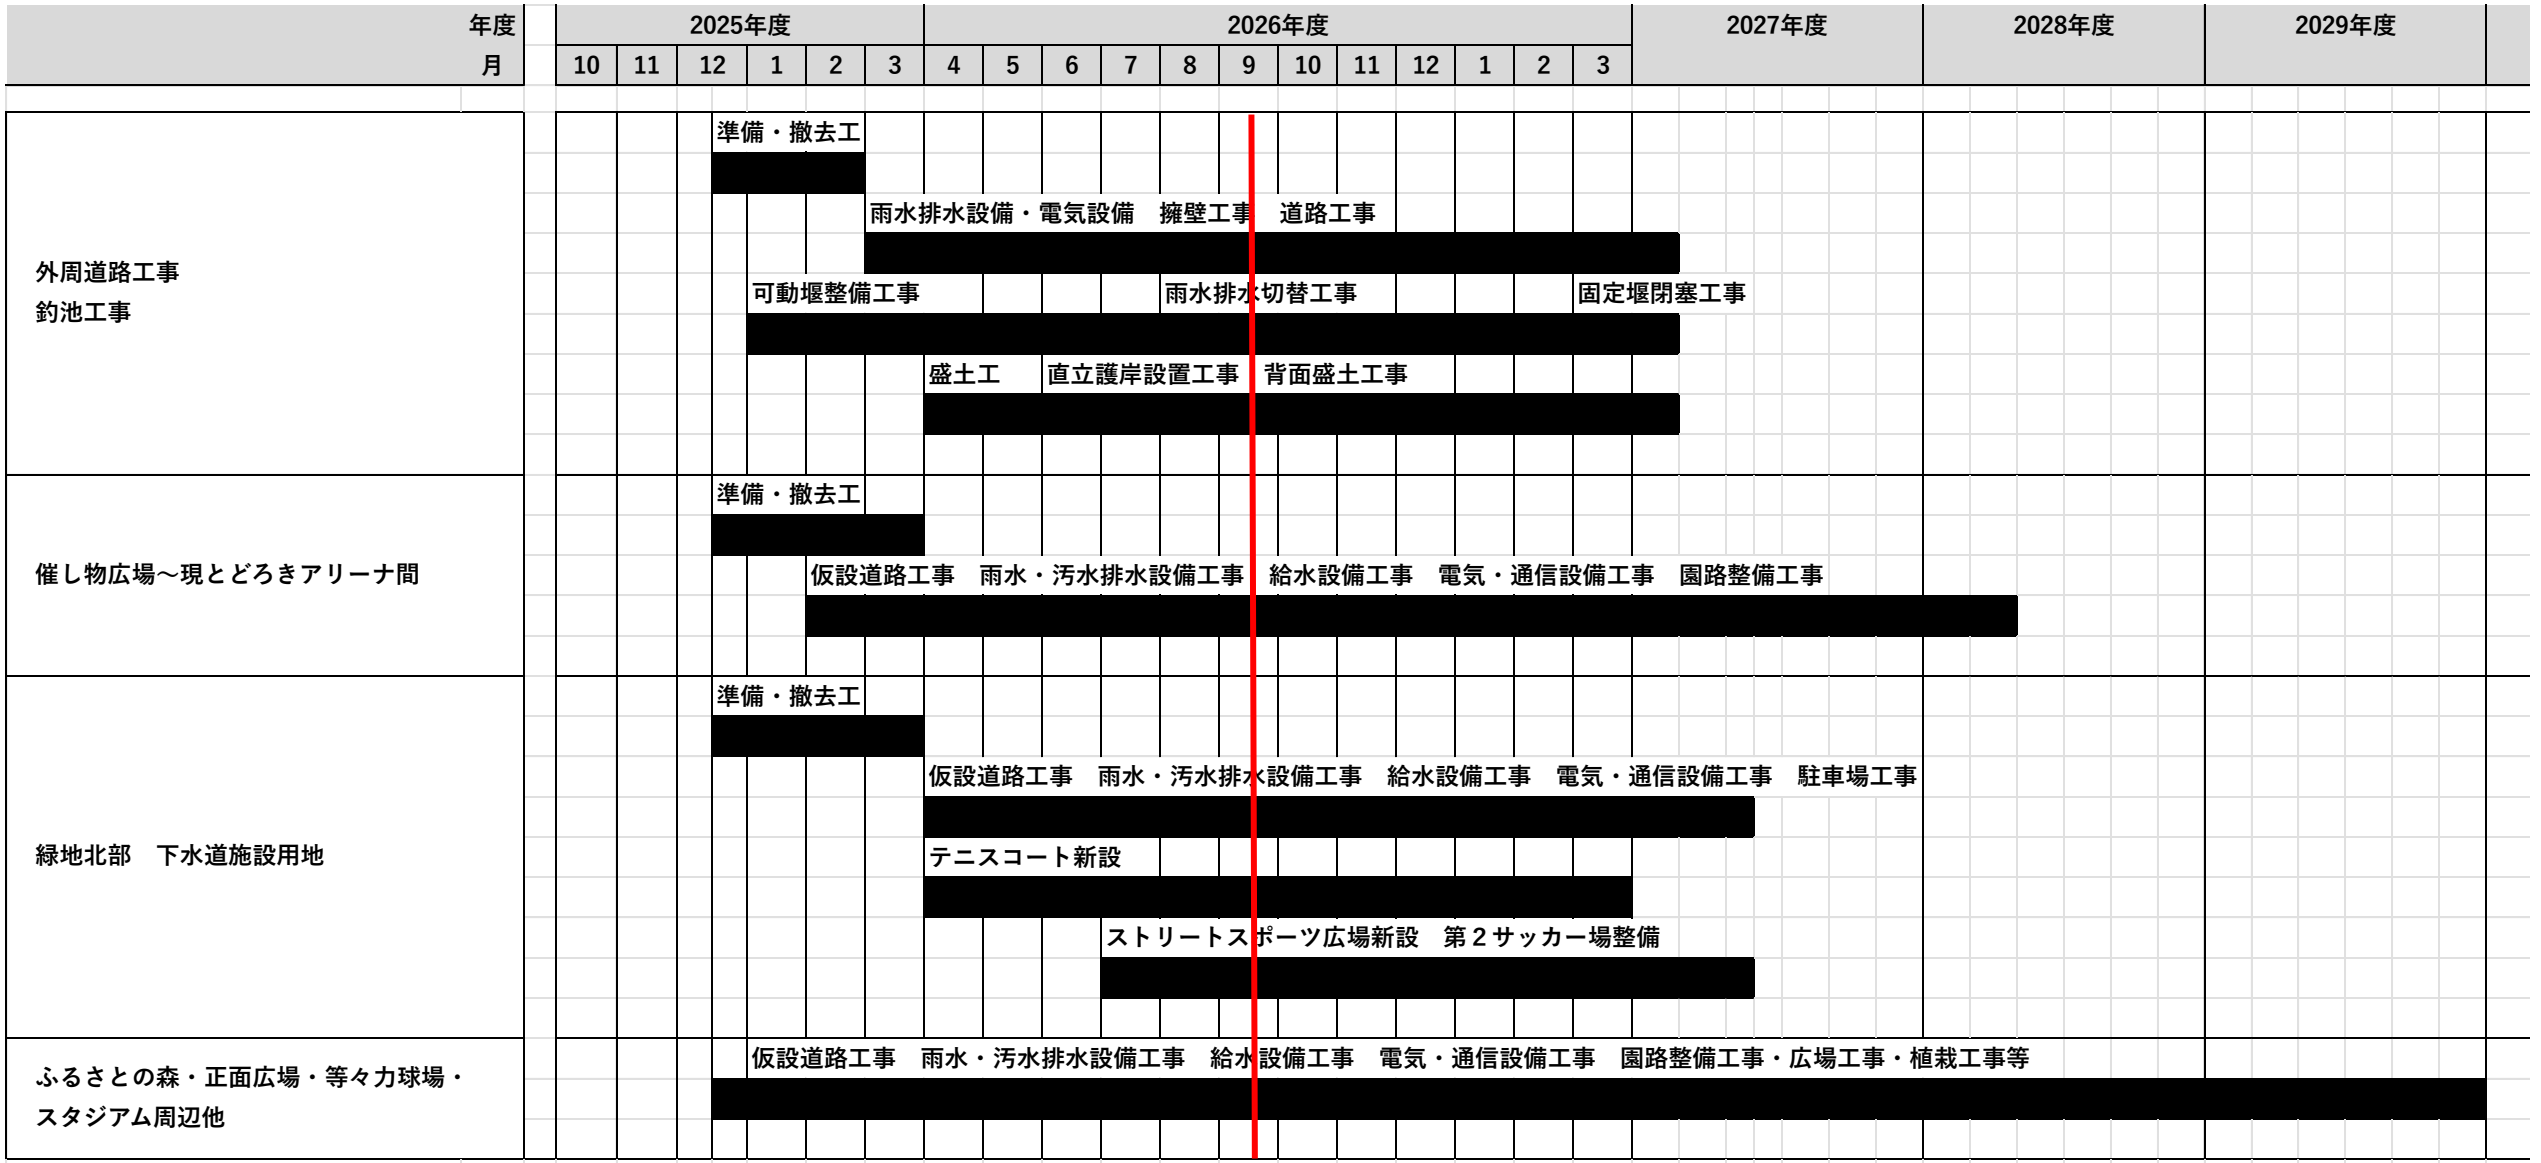

公園基盤施設整備工事

今後の工事予定（外周園路周辺）

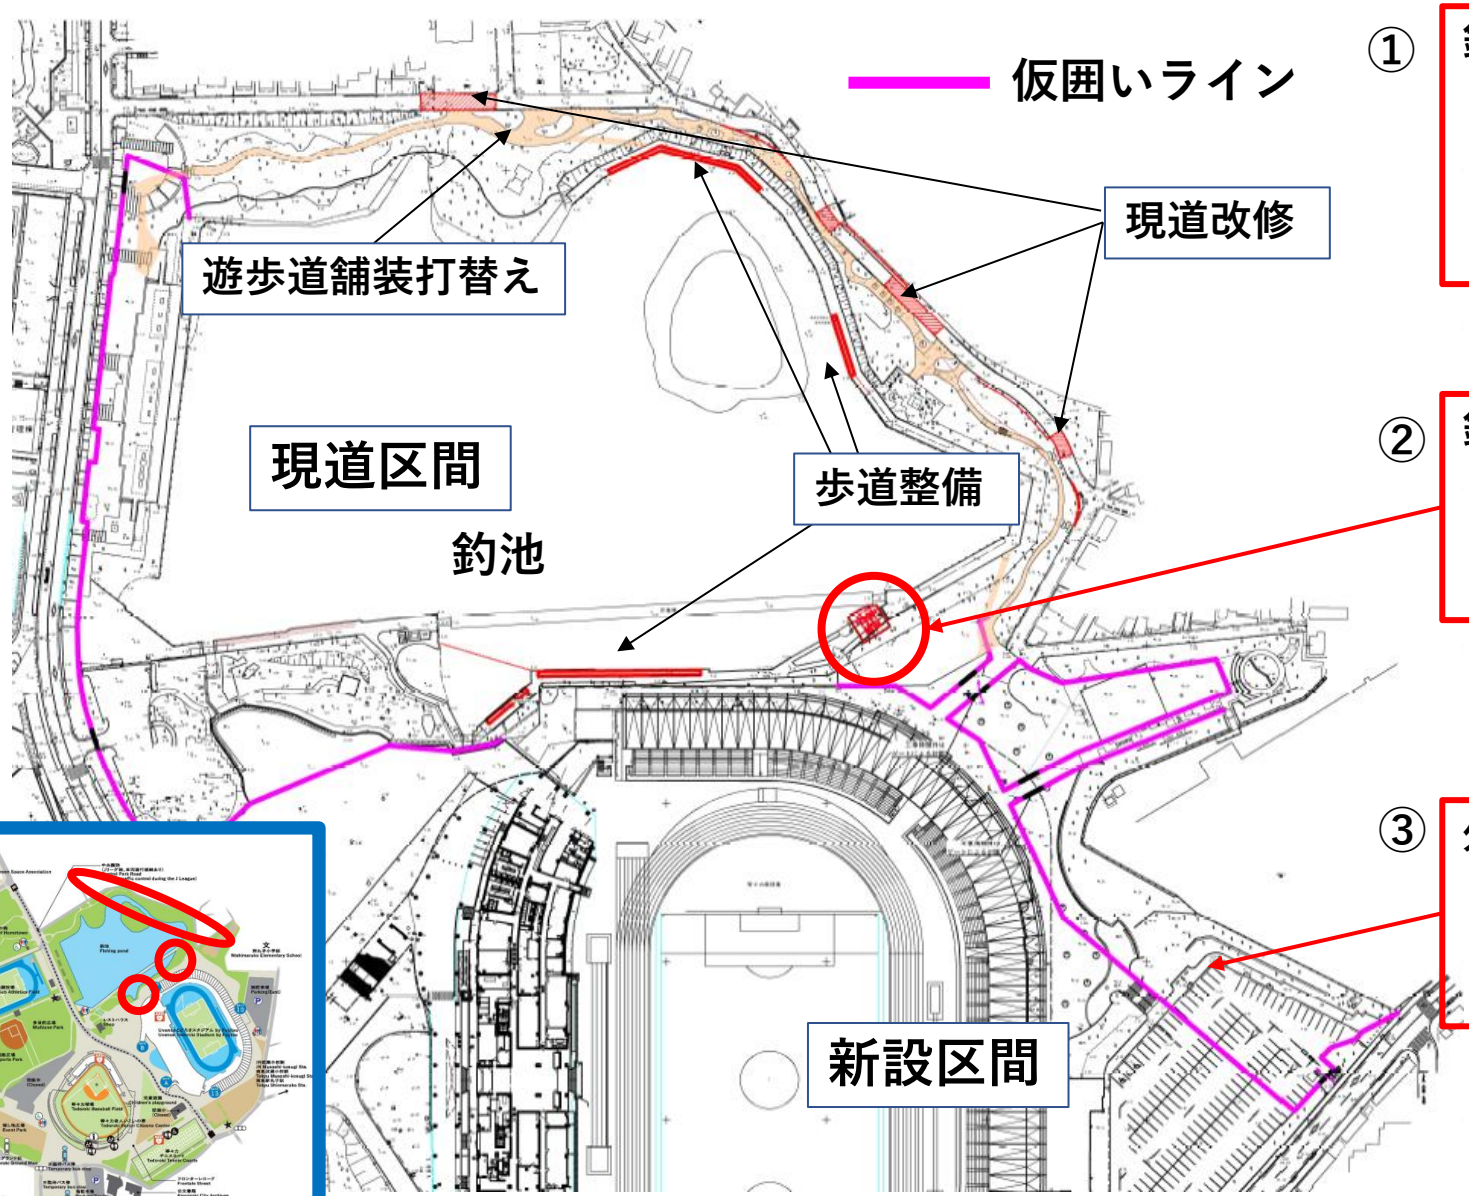

① 釣池周辺
- 現道改修工事　10月上旬頃～
- 遊歩道整備　9月下旬頃～
- 釣池内歩道整備　9月下旬頃～

（2027年5月末完了予定）

② 釣池東部　可動堰設置部
- 可動堰築造　7月中旬頃～現在
- 歩道整備　10月中旬頃～


（2027年5月末完了予定）

③ 外周道路工事
- 擁壁工事　6月中旬頃～
- 道路付帯工事　8月上旬頃～

（2027年5月完了予定）

公園基盤施設整備工事

A計画平面図（②釣池東部・可動堰築造工事）

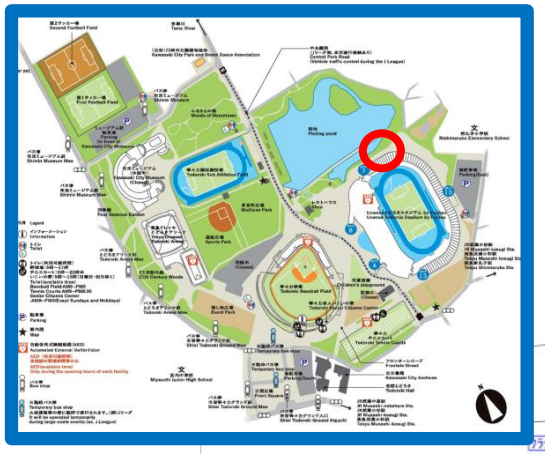

凡例

- ：仮囲いH=3.0m
- ：仮囲いH=1.8m
- ：工事用出入口
- ：敷鉄板

公園基盤施設整備工事

美しい時代へ──東急グループ
東急建設株式会社

Ａ工事写真（②釣池東部）

仮囲い設置状況






2026年8月末 撮影

施工状況



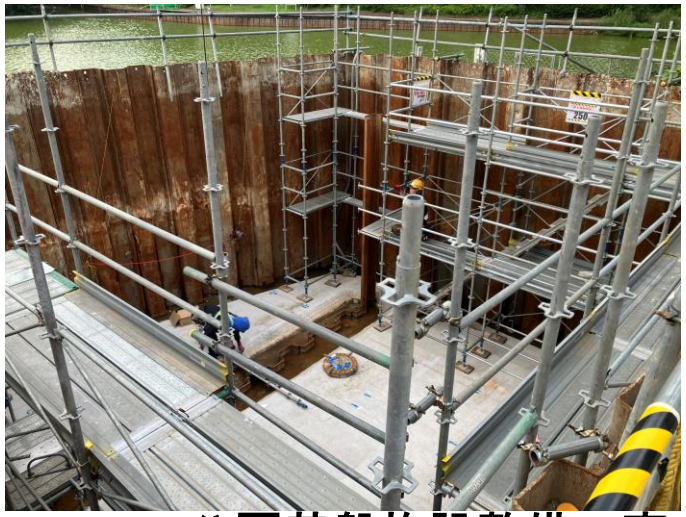

公園基盤施設整備工事

A計画平面図（③外周道路工事　道路新設工事）

50tラフタークレーン

10tダンプ
0.45m3パワーショベル

西丸子小学校

0.45m3パワーショベル

10tダンプ
0.7m3パワーショベル



凡例

：仮囲いH=3.0m

：仮囲いH=1.8m

：工事用出入口

：敷鉄板

公園基盤施設整備工事

Ａ工事写真（③外周道路工事）

仮囲い設置状況





2026年8月末 撮影

施工状況





公園基盤施設整備工事

今後の工事予定（ふるさとの森北側）




・催し物広場より遊具を移設
・歩道側に仮設フェンスを設置予定。
・１０月初旬 遊具供用開始予定



仮設フェンスイメージ

ふるさとの森

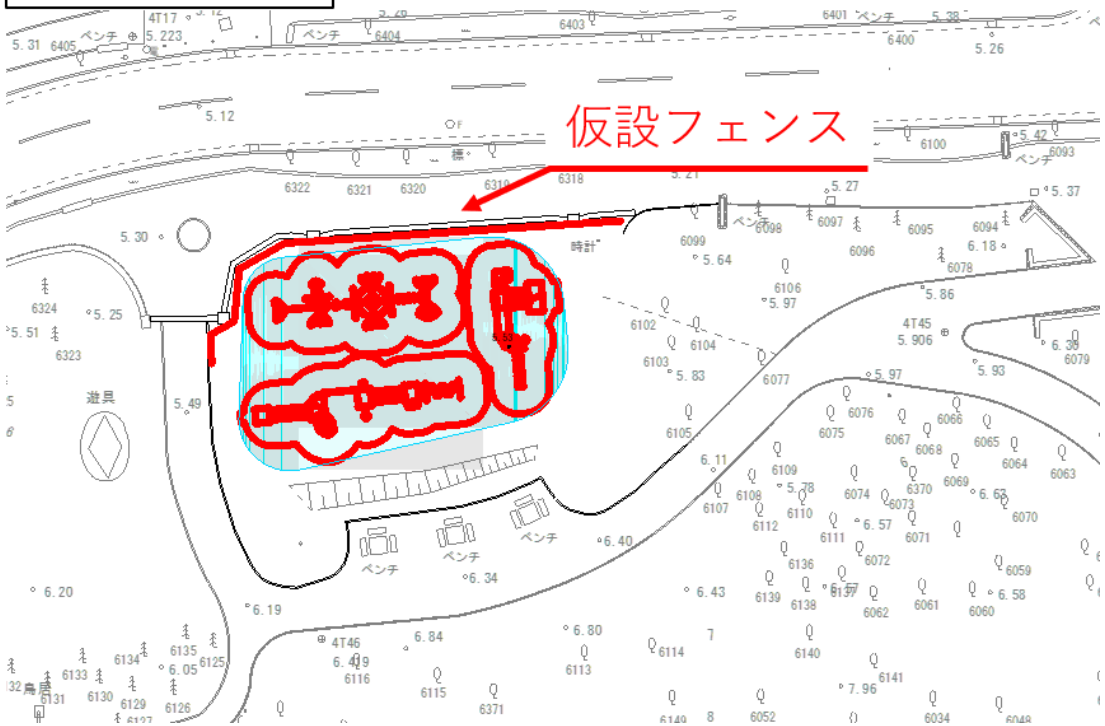

ふるさとの森、遊具移設完了後写真






公園基盤施設整備工事

美しい時代へ── 東急グループ
東急建設株式会社

今後の工事予定（現テニスコート周辺）


・10月より仮囲い設置工事、現施設解体工事着手予定。
・10月からは右図の通り、歩行者、自転車もフロンターレ公園、テニスコート内を通行できませんので、赤矢印部が通行経路となります。

9月予定

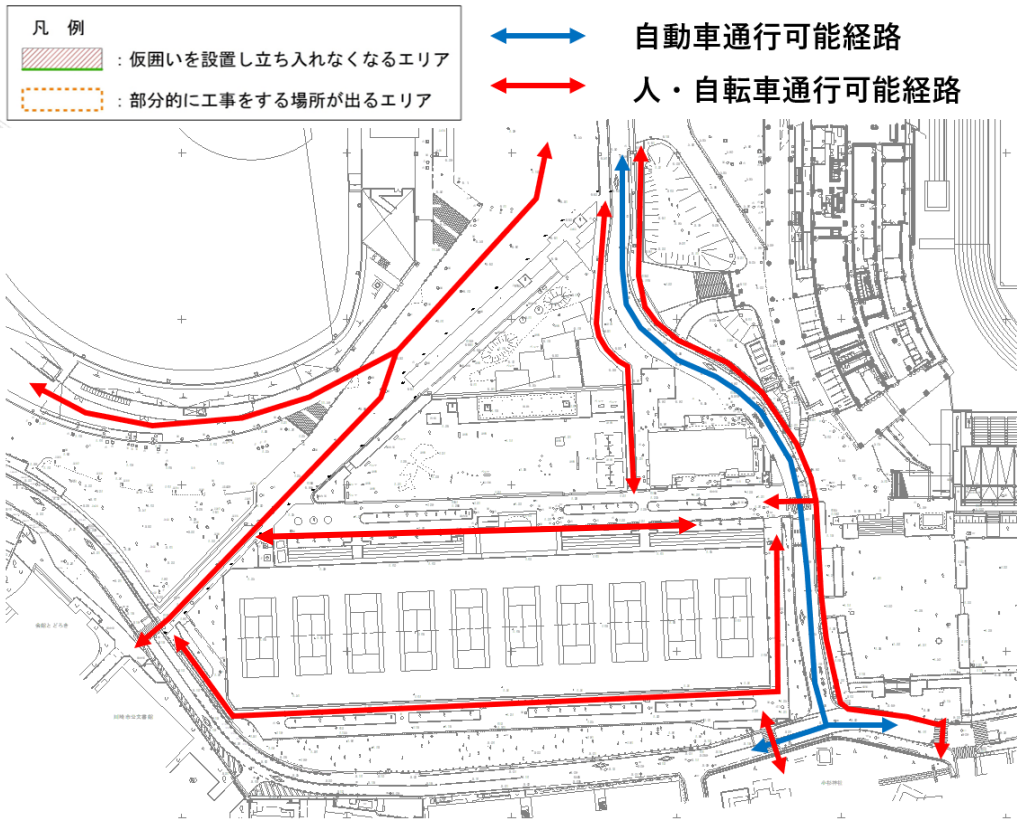

※時期等は現時点での想定であり、変更となる可能性があります。

10月～予定

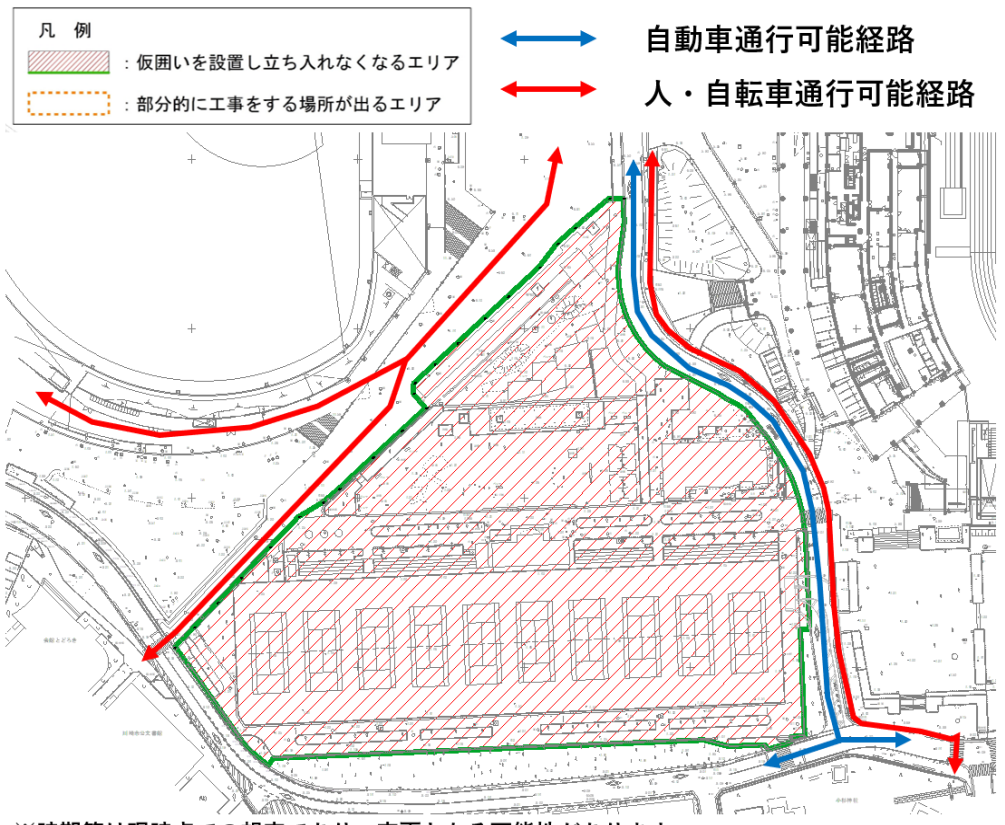

※時期等は現時点での想定であり、変更となる可能性があります。

公園基盤施設整備工事

美しい時代へ――東急グループ
東急建設株式会社


今後の工事予定（緑地北部下水道施設用地）


第２サッカー場
（2026年7月～ 2027年8月末予定）

ストリートスポーツ広場新設
（2026年7月～2027年8月末予定）

テニスコート新設
（工事中、2027年3月末まで）

駐車場整備工事
（～2027年8月末予定）

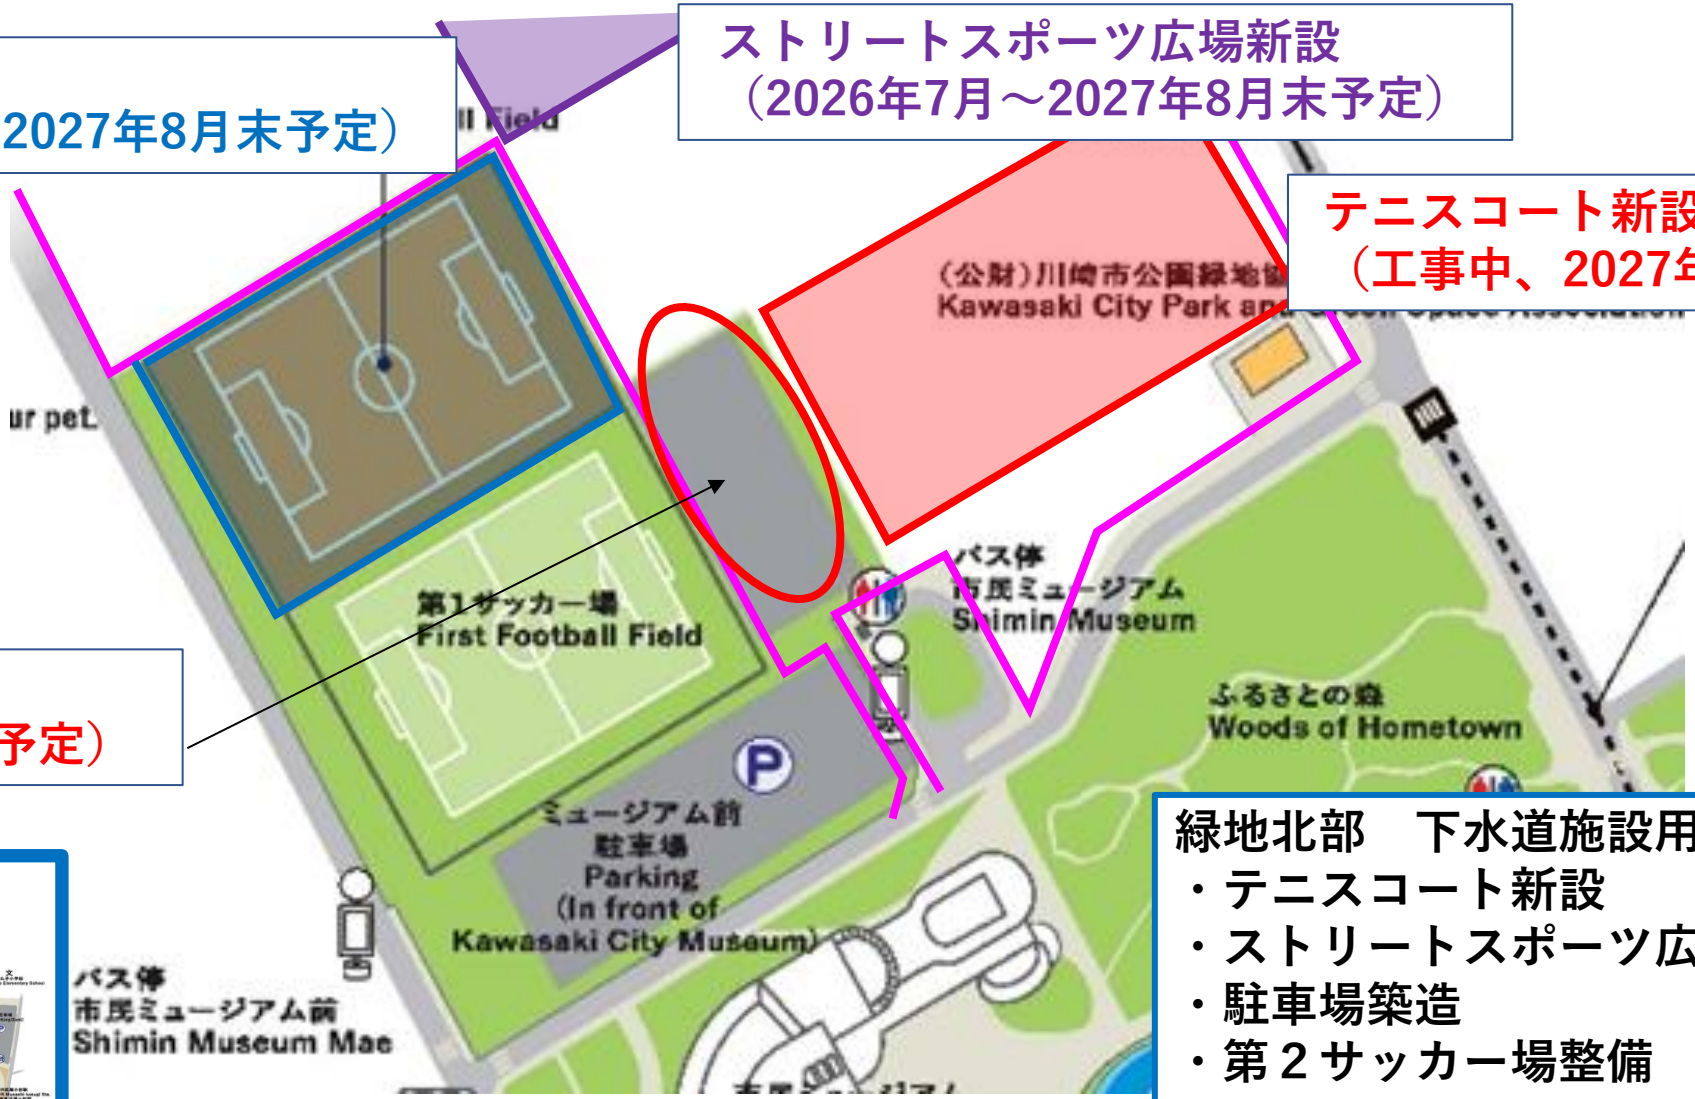

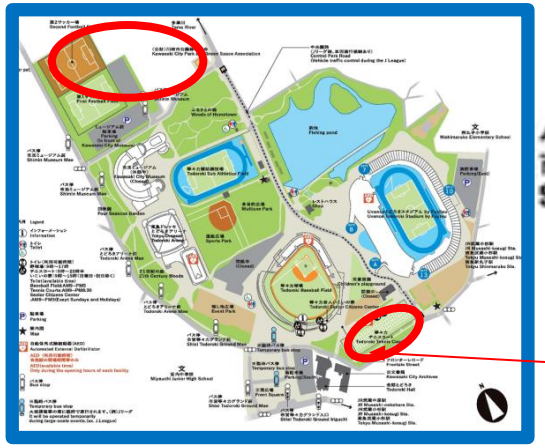

現テニスコート周辺
（2026年10月～着手予定）

緑地北部　下水道施設用地
・テニスコート新設
・ストリートスポーツ広場新設
・駐車場築造
・第２サッカー場整備

公園基盤施設整備工事


今後の工事予定（中央園路）

中央園路における道路切回しについて


中央園路を横断する下水道工事を行うため、
道路の切回し工事を行います。（２箇所）

①北側工事工程（詳細次ページ参照）
1：1回目東側歩道振替
　　2026年10月中旬～
2：2回目車道部、西側歩道部振替
　　2026年12月上旬～
3：切回し道路撤去
　　2027年5月下旬

②南側工事工程
1：車道部、歩道部振替
　　2026年11月中旬～
2：切回し道路撤去
　　2027年2月下旬

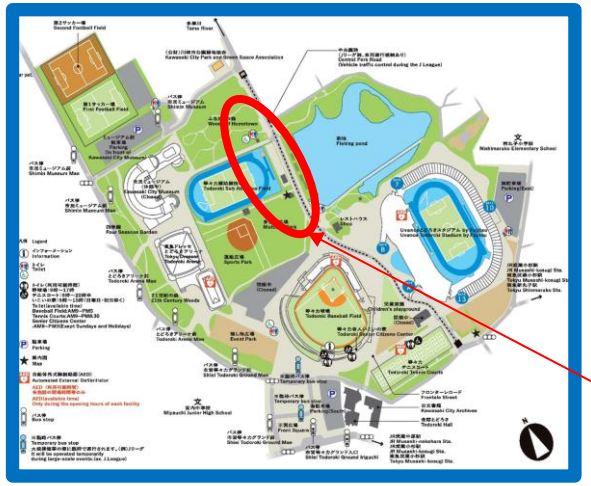

中央園路（道路切回し）
（2026年9月～着手予定）

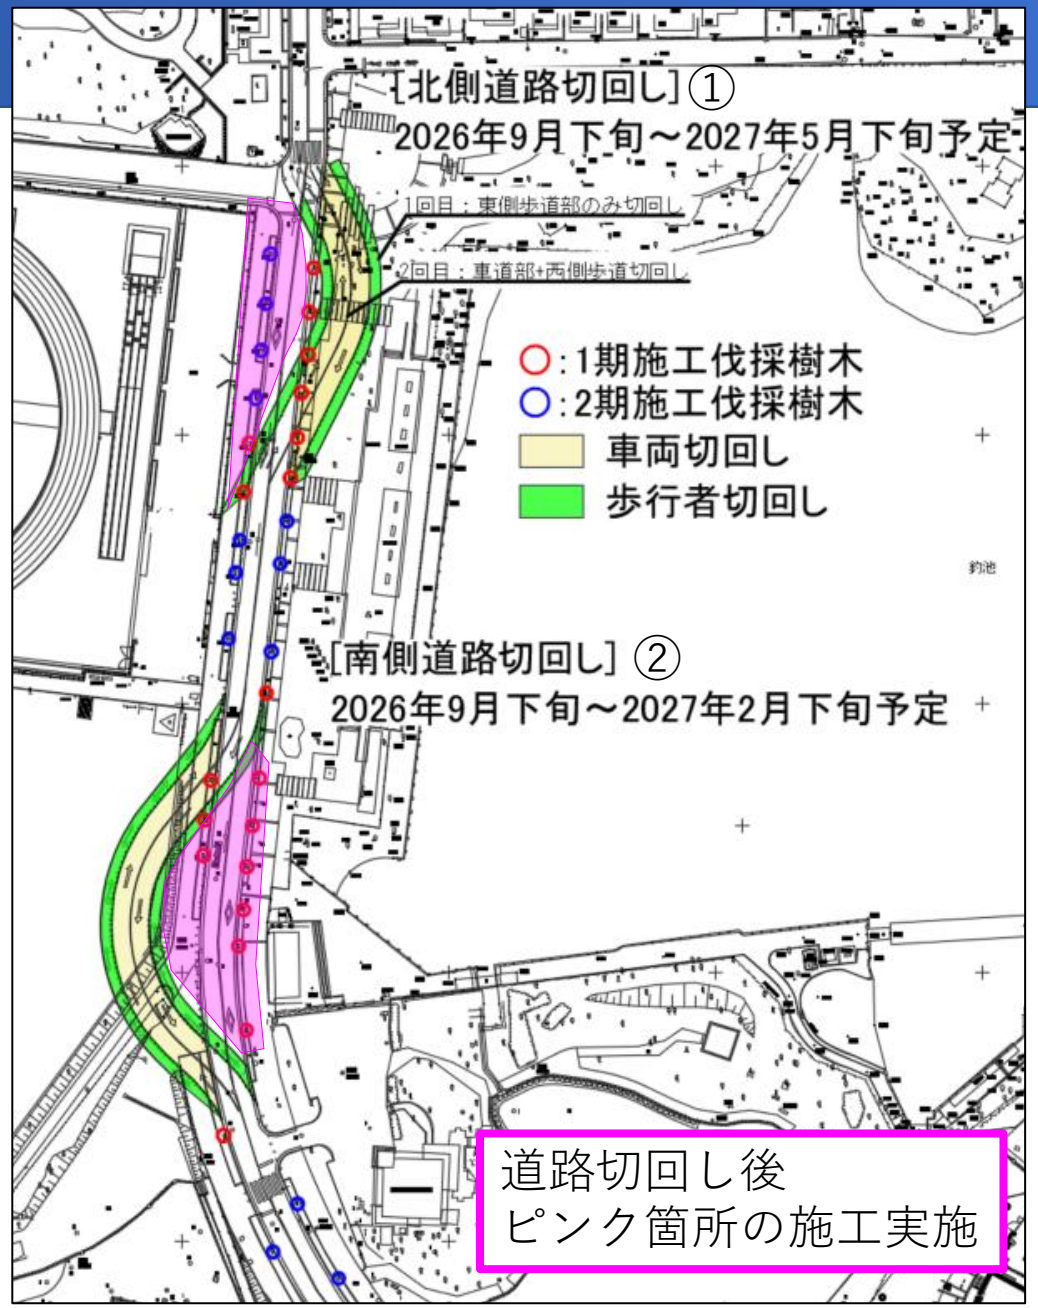


公園基盤施設整備工事


今後の工事予定（中央園路北側）


・下水道工事に伴い、既設道路の切回し工事を行います。
・ 10月中旬より1回目の切回しとして、東側歩道が釣池側へ振替となります。
・ 12月上旬より2回目の切回しとして、車道部と西側歩道部の切回しを行います。

10月中旬～1回目切回し

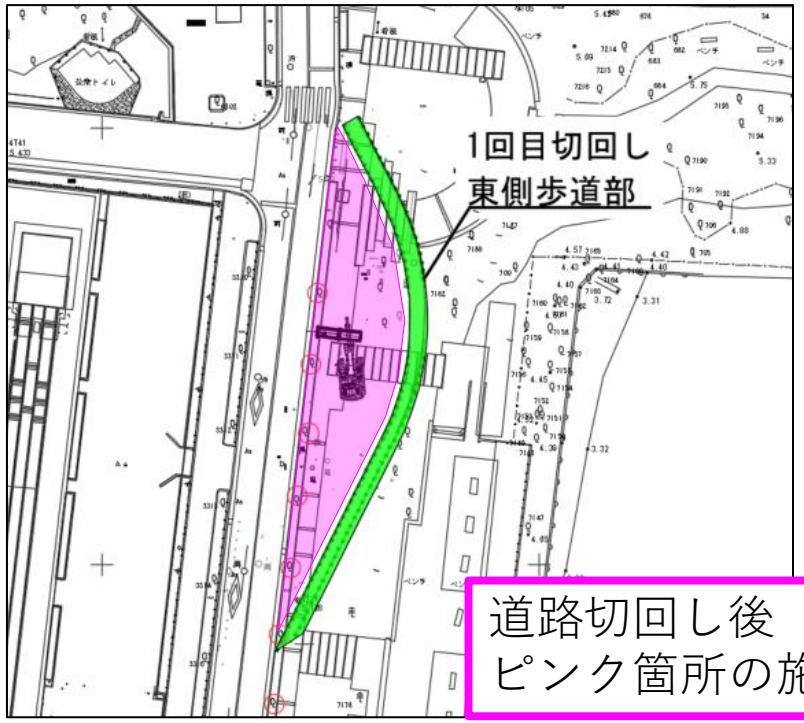

12月上旬～2回目切回し

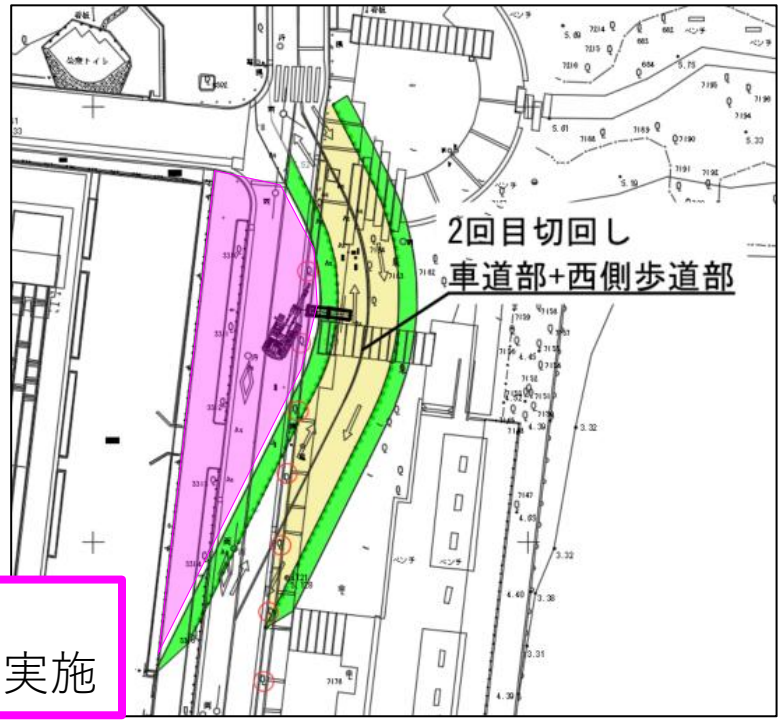

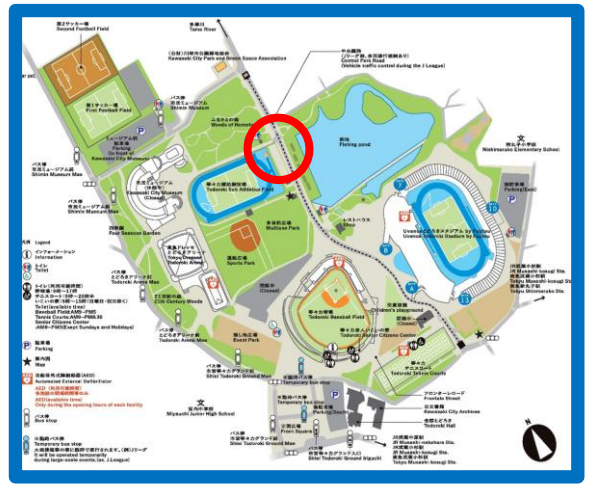

道路切回し後
ピンク箇所の施工実施

② 小規模行政施設建設･解体工事


施　工　者　　東急建設株式会社（建築）

工事概要

施　　工　　者	東急建設株式会社
解　体　施　設	現テニスコートクラブハウス、(旧)中部公園事務所、売店 レストハウス他
整　備　施　設	サッカーコートクラブハウス、テニスコートクラブハウス 釣池管理棟、便所他
延　床　面　積	解体面積約800㎡　　新築面積843㎡
構　　造	RC造(地上1階)・S造(地上1階)
整　備　期　間	2025年12月15日～2030年3月31日 (予定)

美しい時代へ── 東急グループ
東急建設株式会社

解体建屋配置図

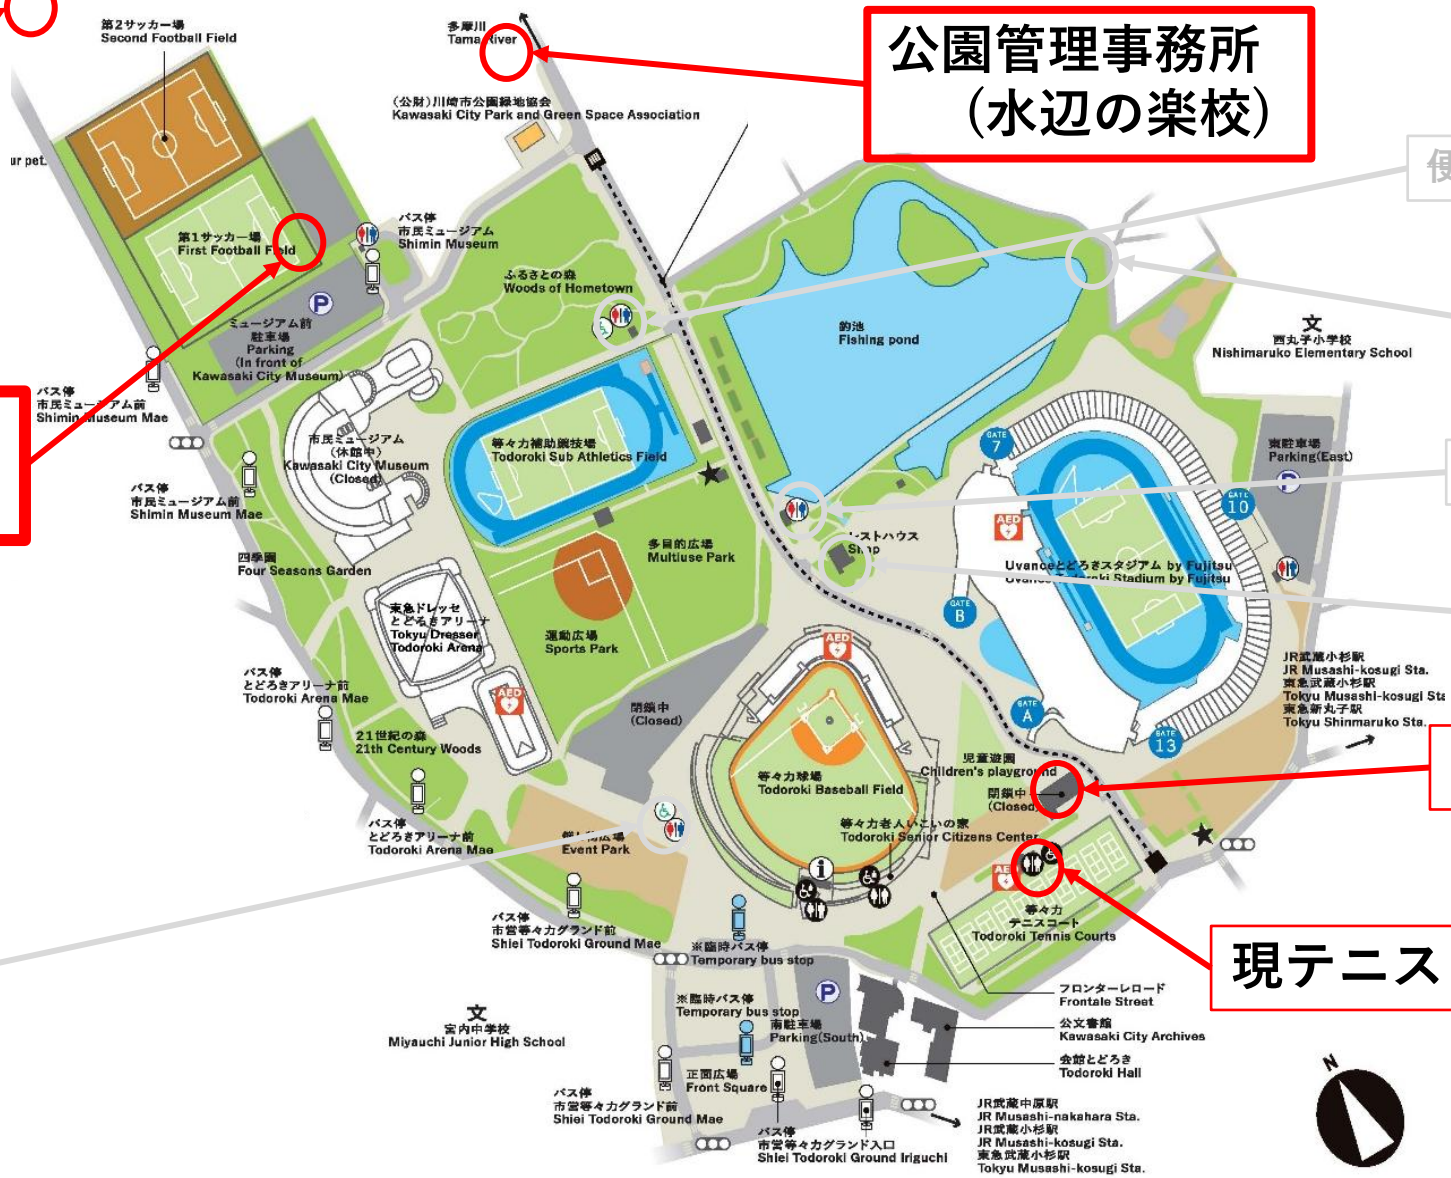

便所(宮内歩道橋)

公園管理事務所
(水辺の楽校)

便所(ふるさとの森)

便所(釣池)

サッカーコート
更衣室他

売店、便所(釣池)

レストハウス

旧中部公園事務所


便所
(野球場南側)

現テニスコートクラブハウス他


小規模行政施設建設・解体工事

美しい時代へ──東急グループ
東急建設株式会社

小規模行政施設配置図

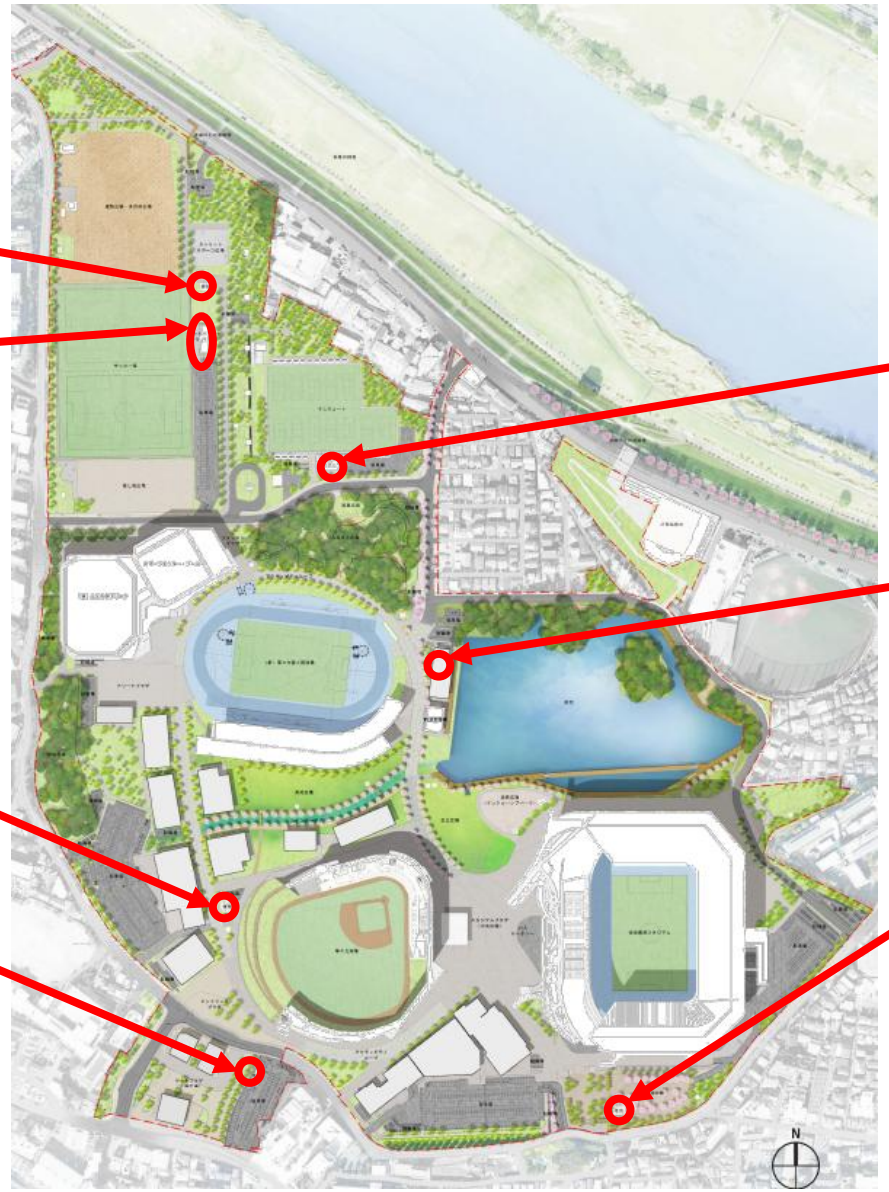

工事予定表

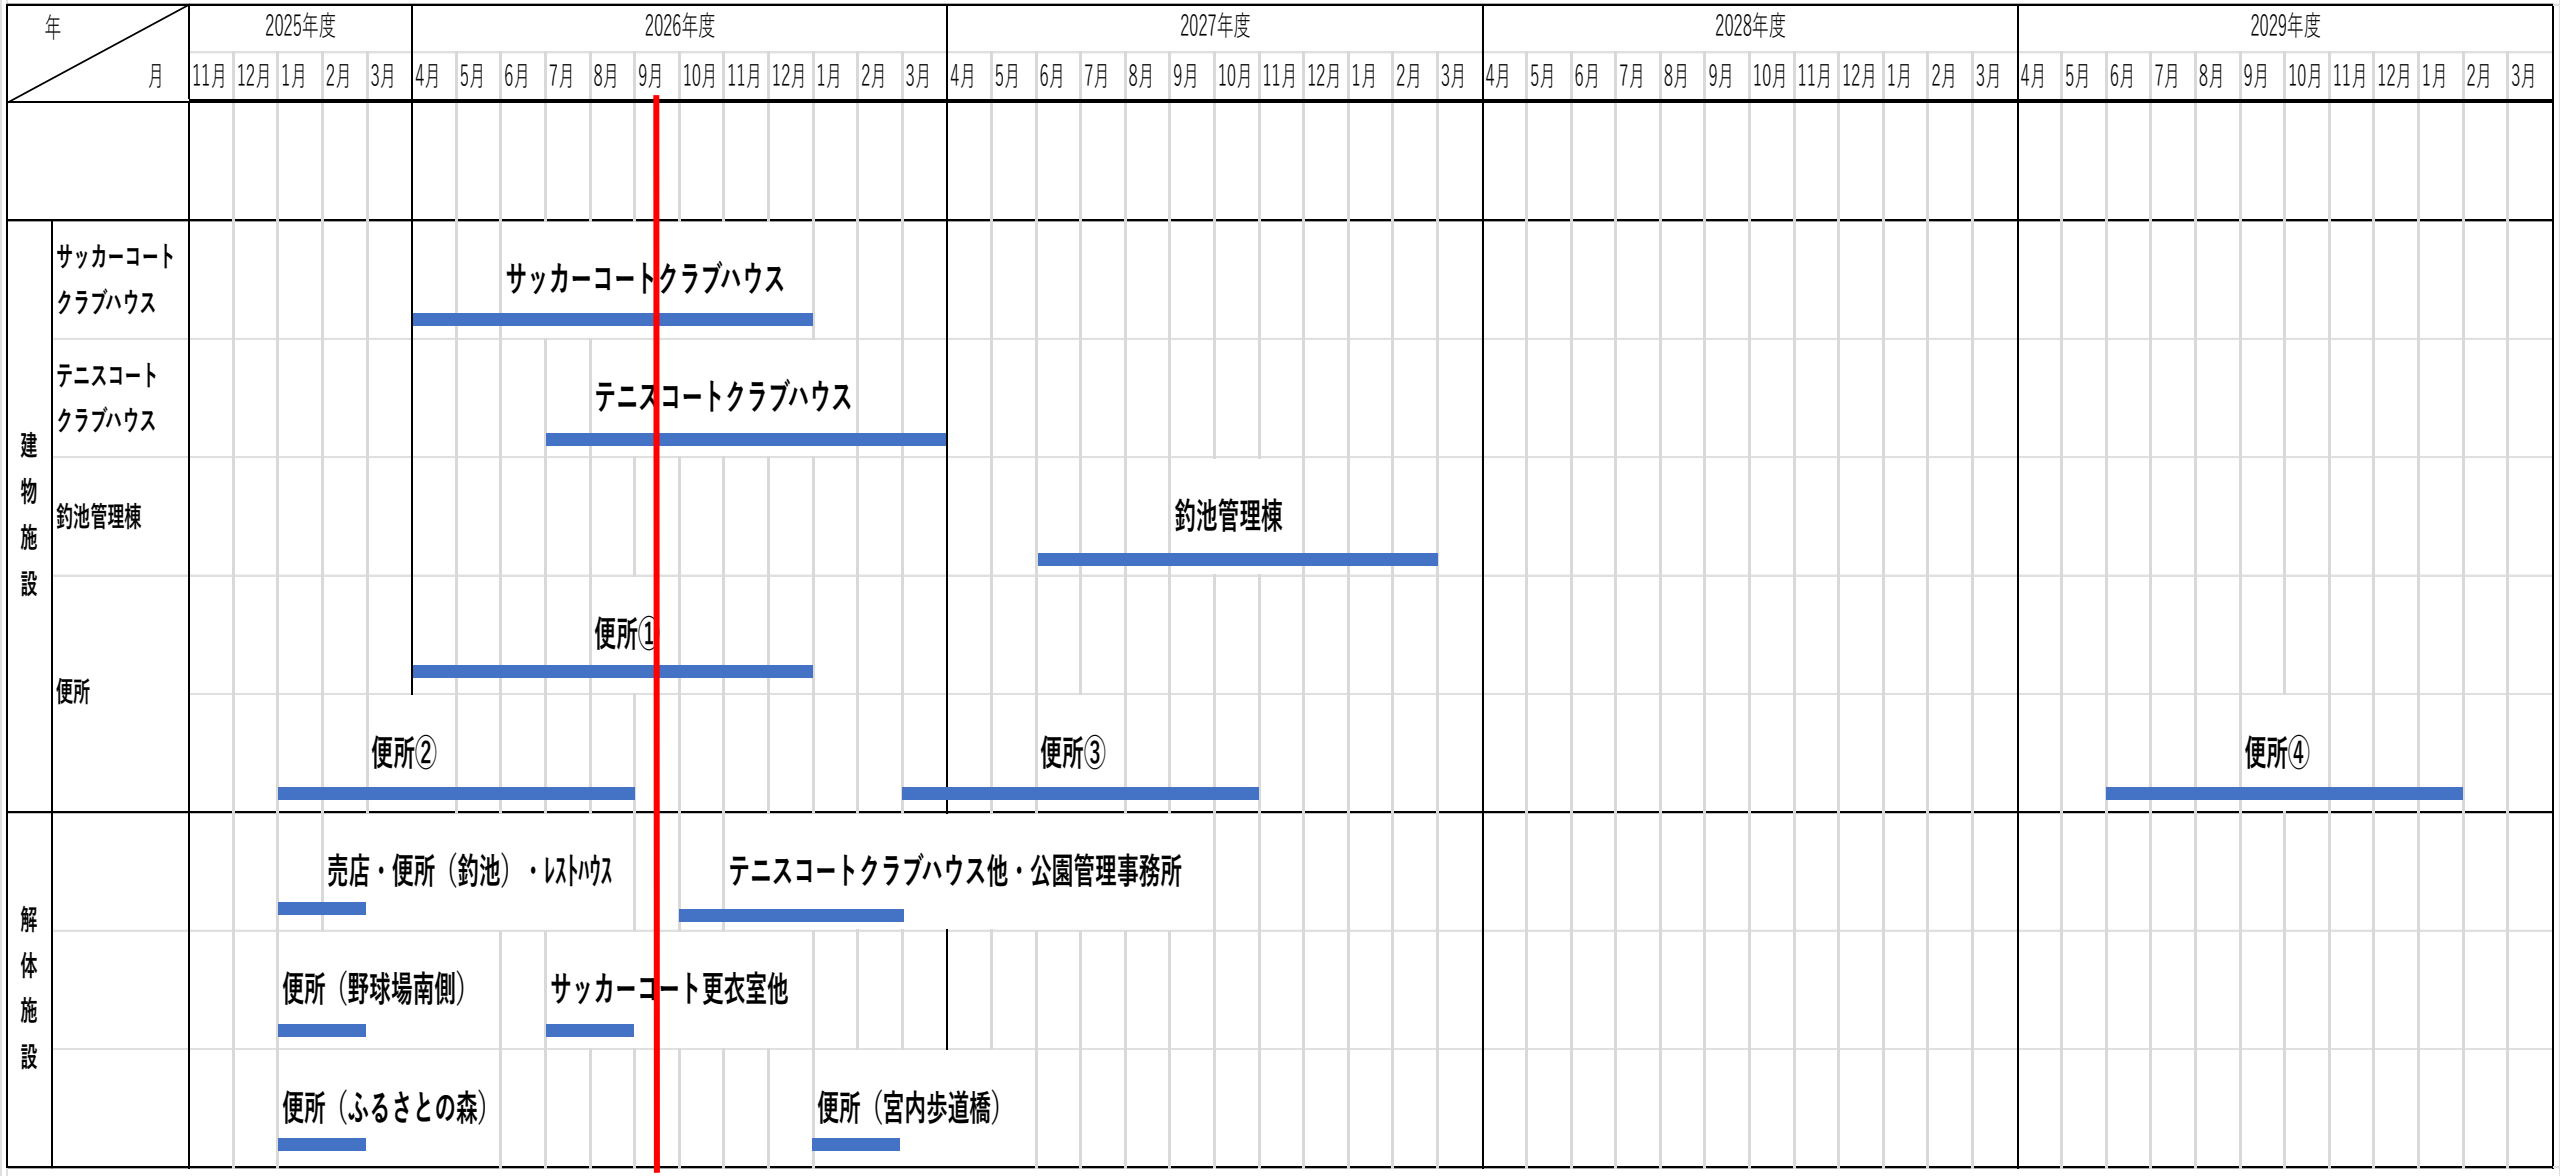

小規模行政施設建設･解体工事


美しい時代へ── 東急グループ
東急建設株式会社

石綿除去について

・石綿（アスベスト）の調査結果
既存建物には事前調査により一部個所に石綿が使用されていることを確認しています。

・石綿除去作業
石綿除去作業は建屋解体の前に実施し全ての石綿を除去します。
関係法令に則り、飛散防止措置等適切な処置を実施した上で除去作業・処分を行います。

石綿建材使用施設配置図

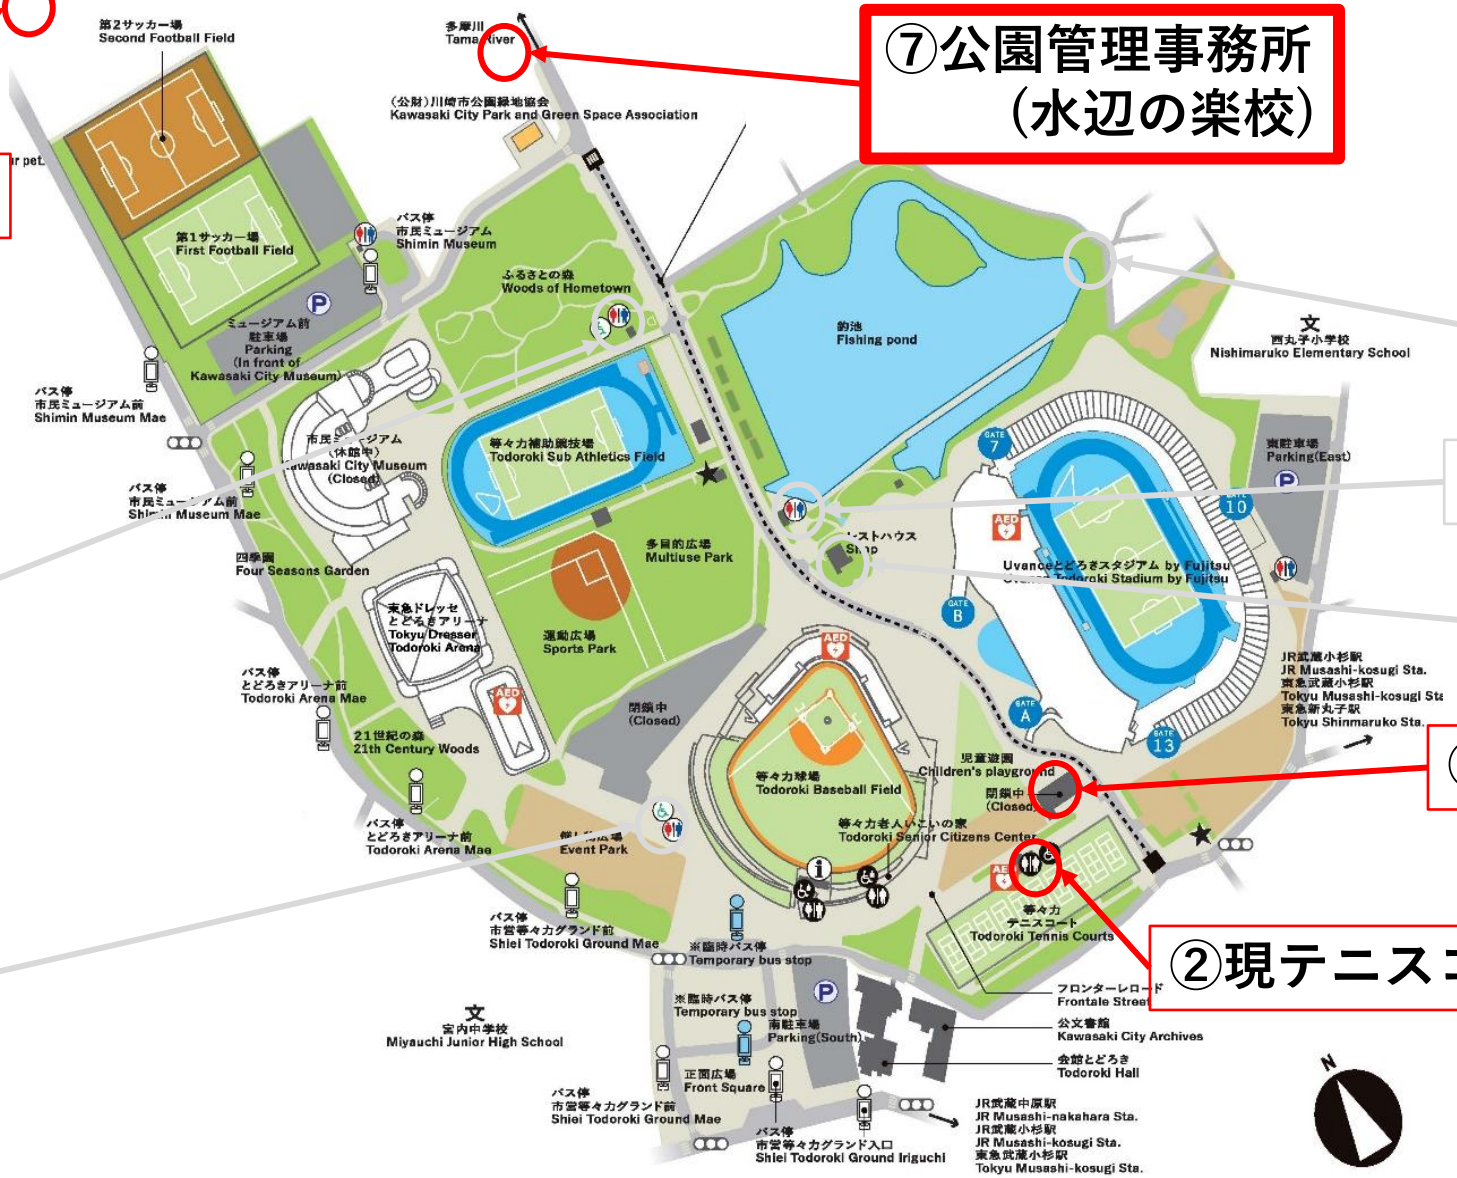

⑦公園管理事務所
（水辺の楽校）

⑨便所（宮内歩道橋）

⑥便所（釣池）

⑤売店、~~便所（釣池）~~

⑧便所（~~ふるさとの森~~）

④~~レストハウス~~

③旧中部公園事務所

①~~便所~~
（~~野球場南側~~）

②現テニスコートクラブハウス他


小規模行政施設建設・解体工事

美しい時代へ── 東急グループ
東急建設株式会社

工事写真



6/11_便所② 型枠工事（杉板型枠）

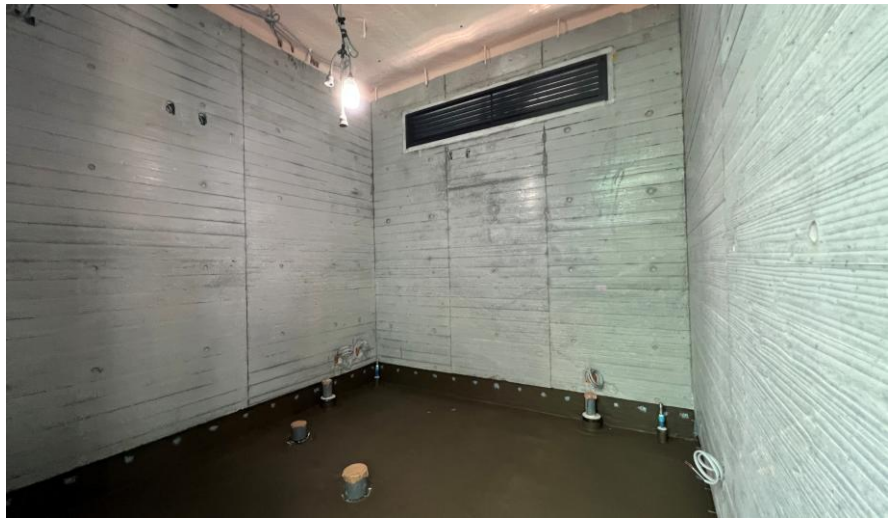

7/25_便所② 防水工事



8/11_便所② 内装工事



8/11_便所② 外観写真

美しい時代へ── 東急グループ
東急建設株式会社

工事写真



8/11_便所① 基礎工事



8/11_サッカーコートクラブハウス 基礎工事



8/11_テニスコートクラブハウス基礎工事




7/29_サッカー場　管理室・シャワー室解体後

小規模行政施設建設･解体工事

今後の工事予定


ゾーン① 便所② 延べ床面積32.09㎡

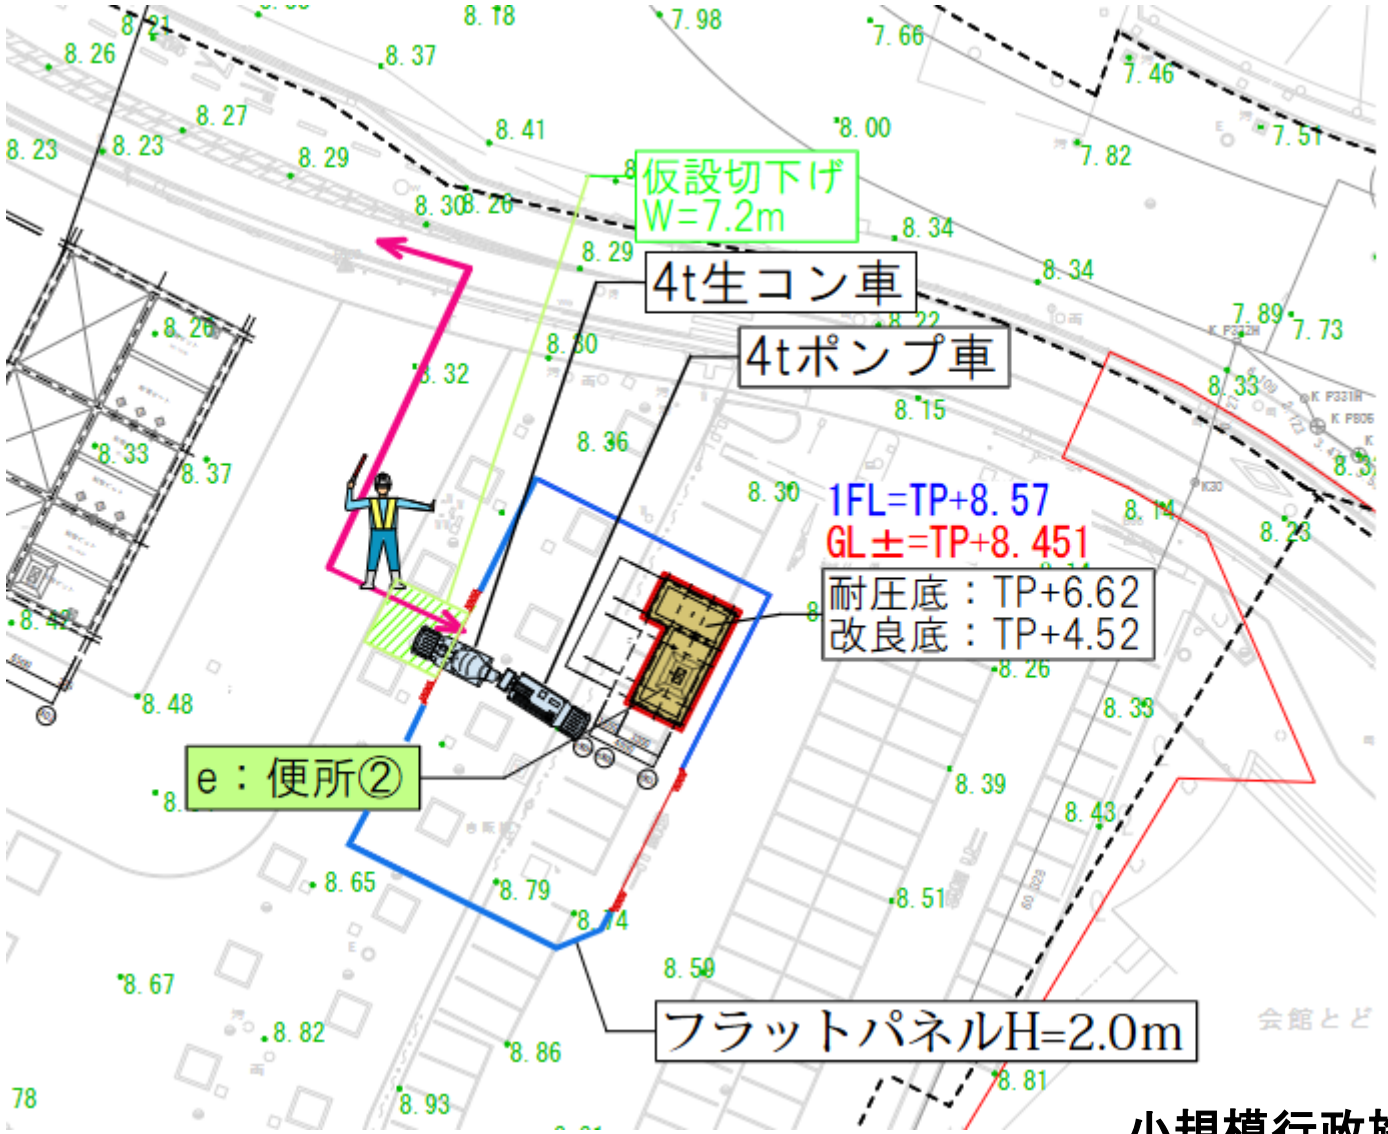

2026年3月～　山留　掘削
2026年4月～　基礎工事
2026年6月～　地上躯体工事
2026年7月～　内装工事
2026年8月末　工事完了
2026年9月～　行政検査・引渡し
2026年10月～　供用開始

今後の工事予定


ゾーン⑥ サッカーコートクラブハウス 延べ床面積150.8㎡
便所①　延べ面積46.23㎡

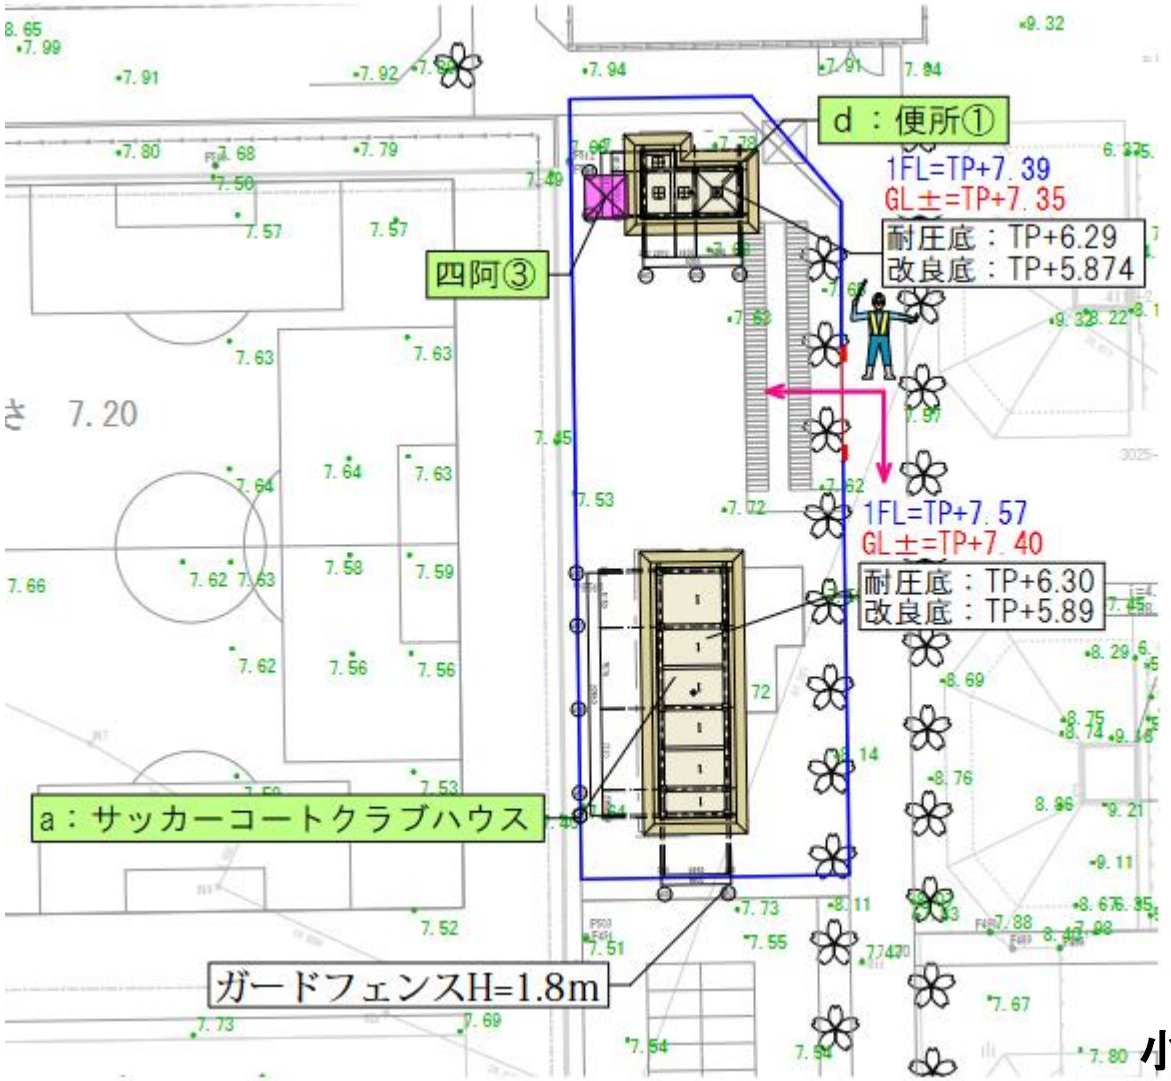

2026年4月～　掘削
2026年5月～　浅層改良
2026年6月～　基礎工事
2026年8月～　地上躯体工事
2026年9月～　鉄骨・屋根・外壁工事
2026年10月～ 内装工事
2026年12月末 工事完了予定

今後の工事予定

ゾーン⑥ テニスコートクラブハウス 延べ床面積265.5㎡

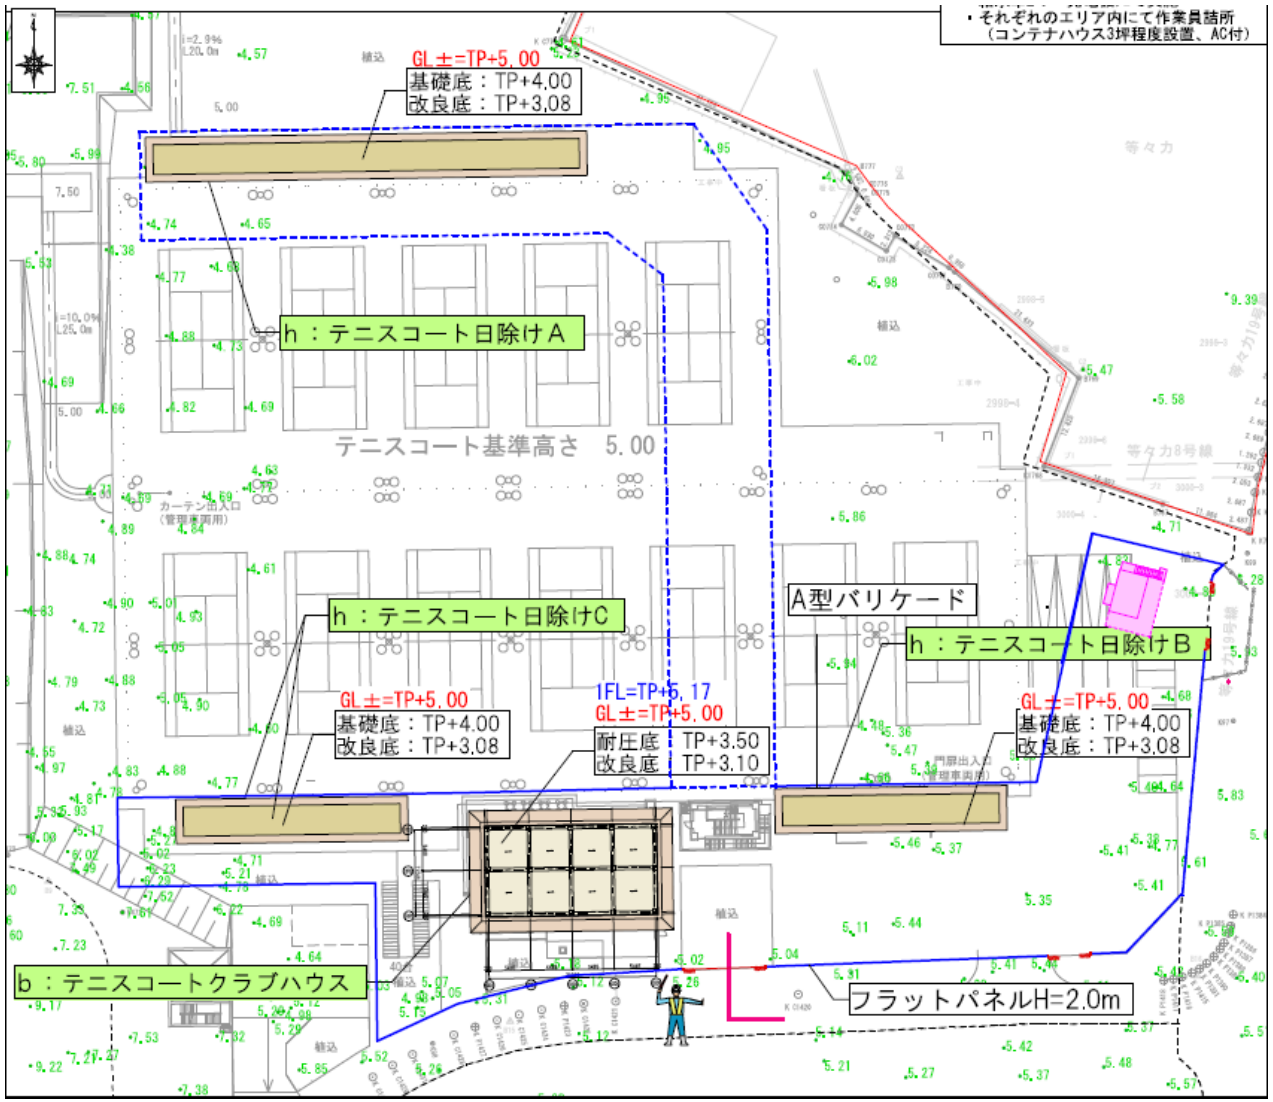

テニスコートクラブハウス
2026年7月～　掘削
2026年7月～　浅層改良
2026年8月～　基礎工事
2026年10月～　鉄骨・屋根・外壁工事
2026年11月～　内装工事
2027年1月末　工事完了予定

テニスコート日除け
2026年11月～27年3月末

③ （新）等々力陸上競技場建設工事

施　工　者　　株式会社フジタ

工事概要


施　　工　　者	株式会社フジタ
解　体　施　設	現中央管理棟
整　備　施　設	新陸上競技場・ランニングステーション
延　床　面　積	4,757.20㎡
構　　造	S造（地上2階）
整　備　期　間	2025年12月15日～2027年4月15日（予定）

配置図




（新）等々力陸上競技場建設工事

工事予定表

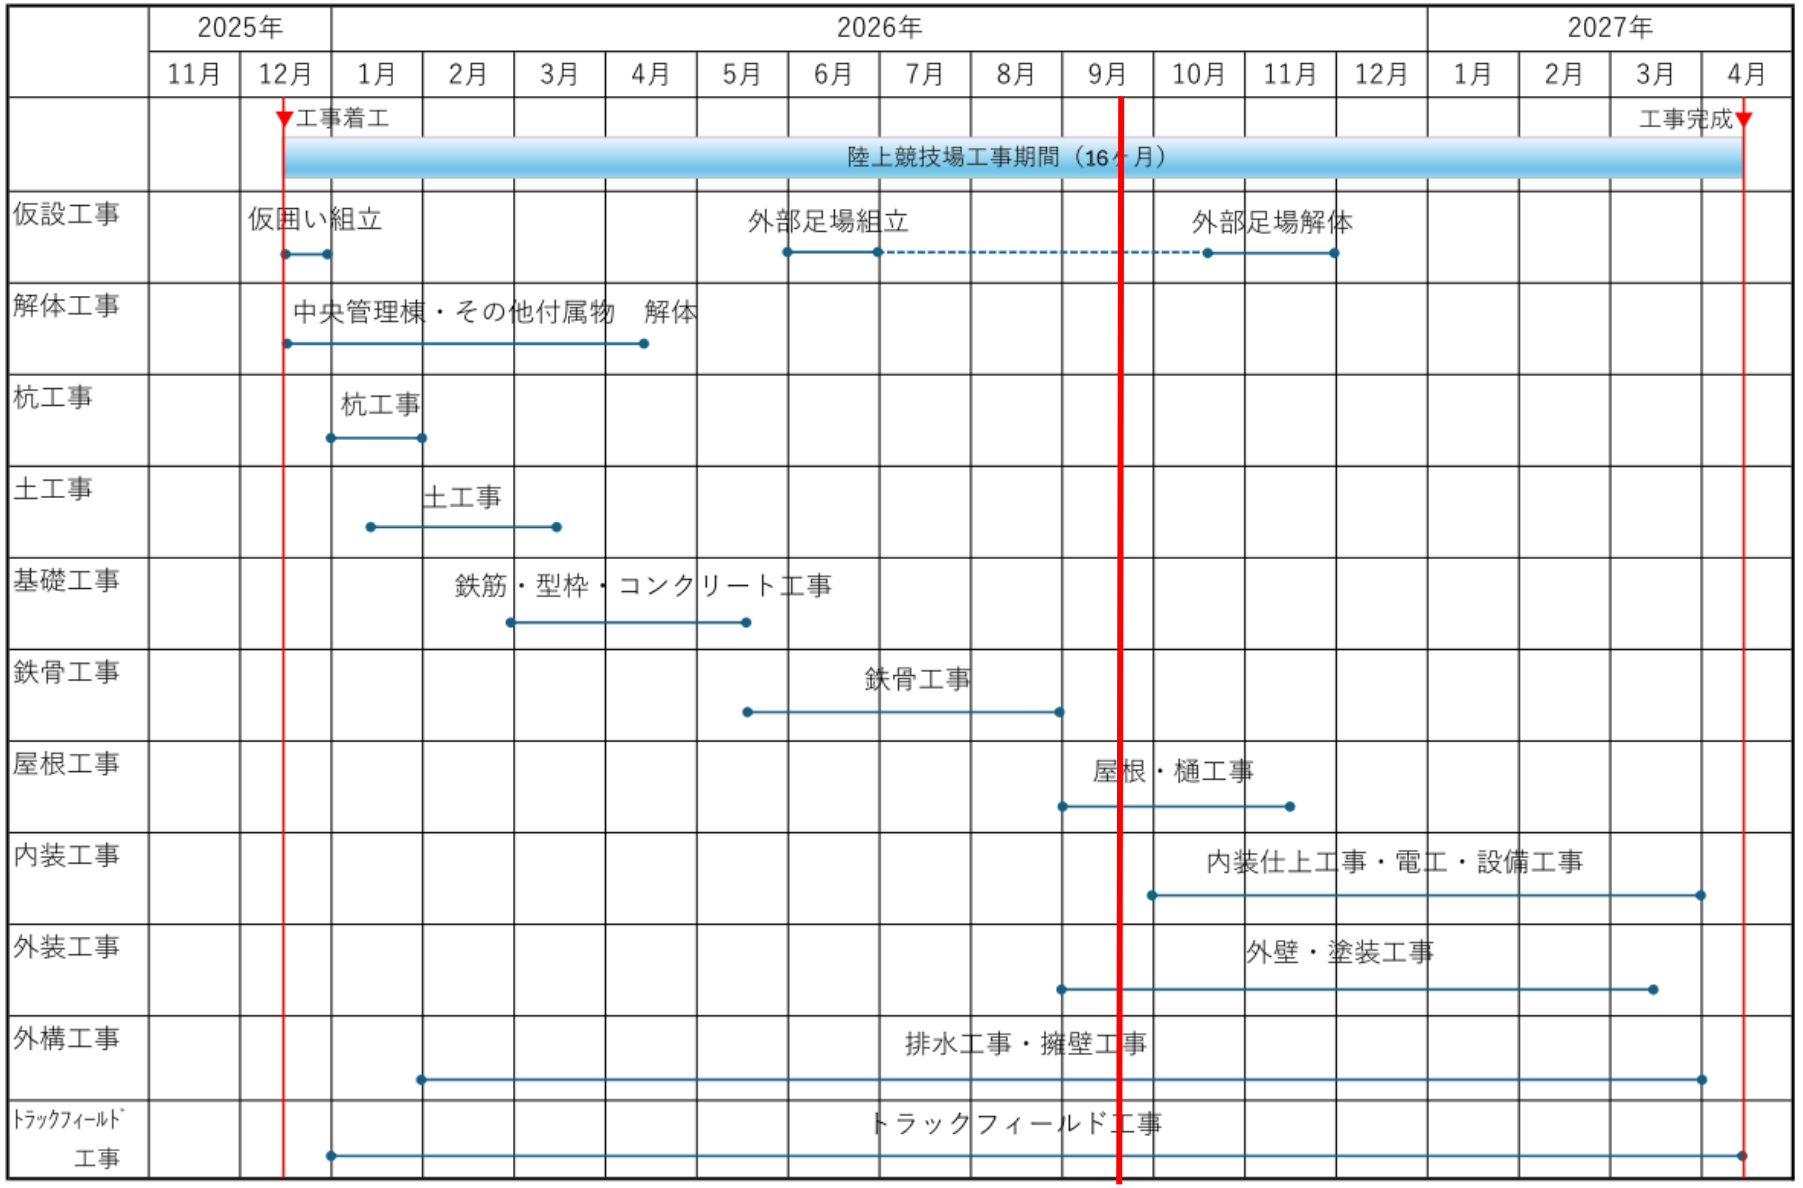

（新）等々力陸上競技場建設工事

計画平面図

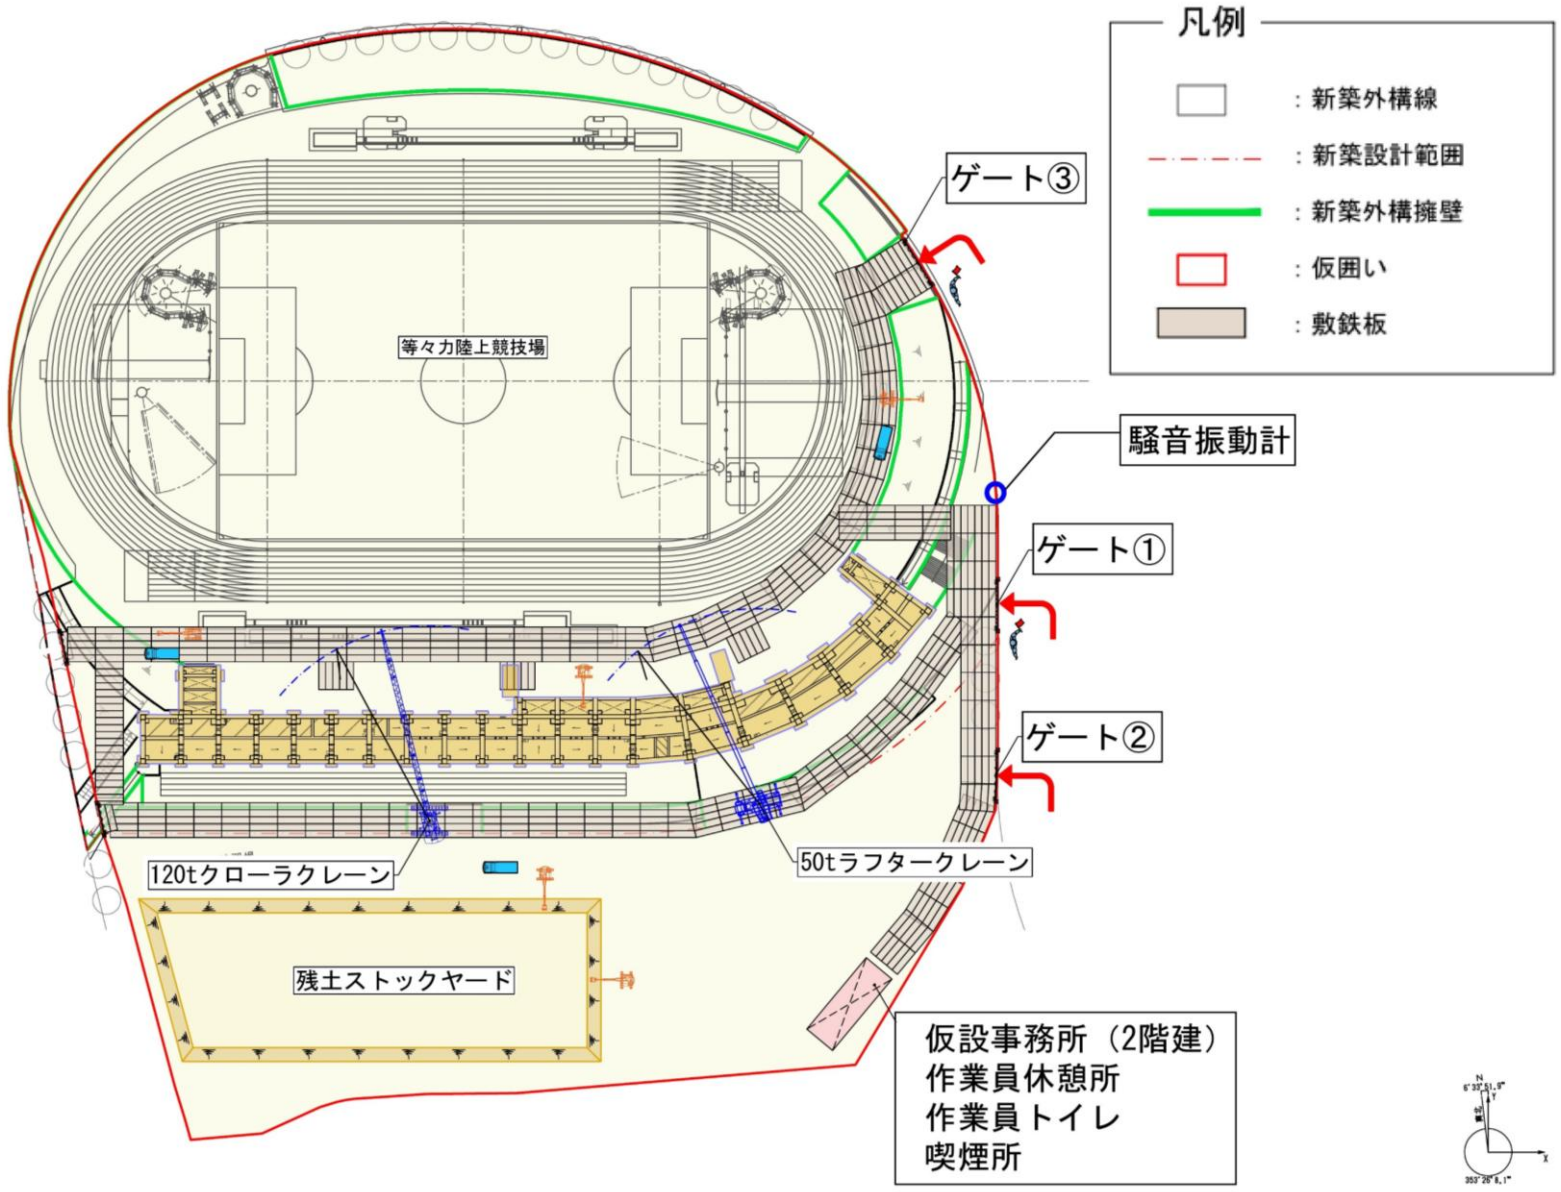

（新）等々力陸上競技場建設工事

工事写真



全景　8/17



観客スタンド鉄骨建方工事　8/11



トラックフィールド競技施設工事　7/31





観客スタンド２階床躯体工事　7/31

（新）等々力陸上競技場建設工事

今後の工事予定

９月～外壁工事
10月～屋根工事

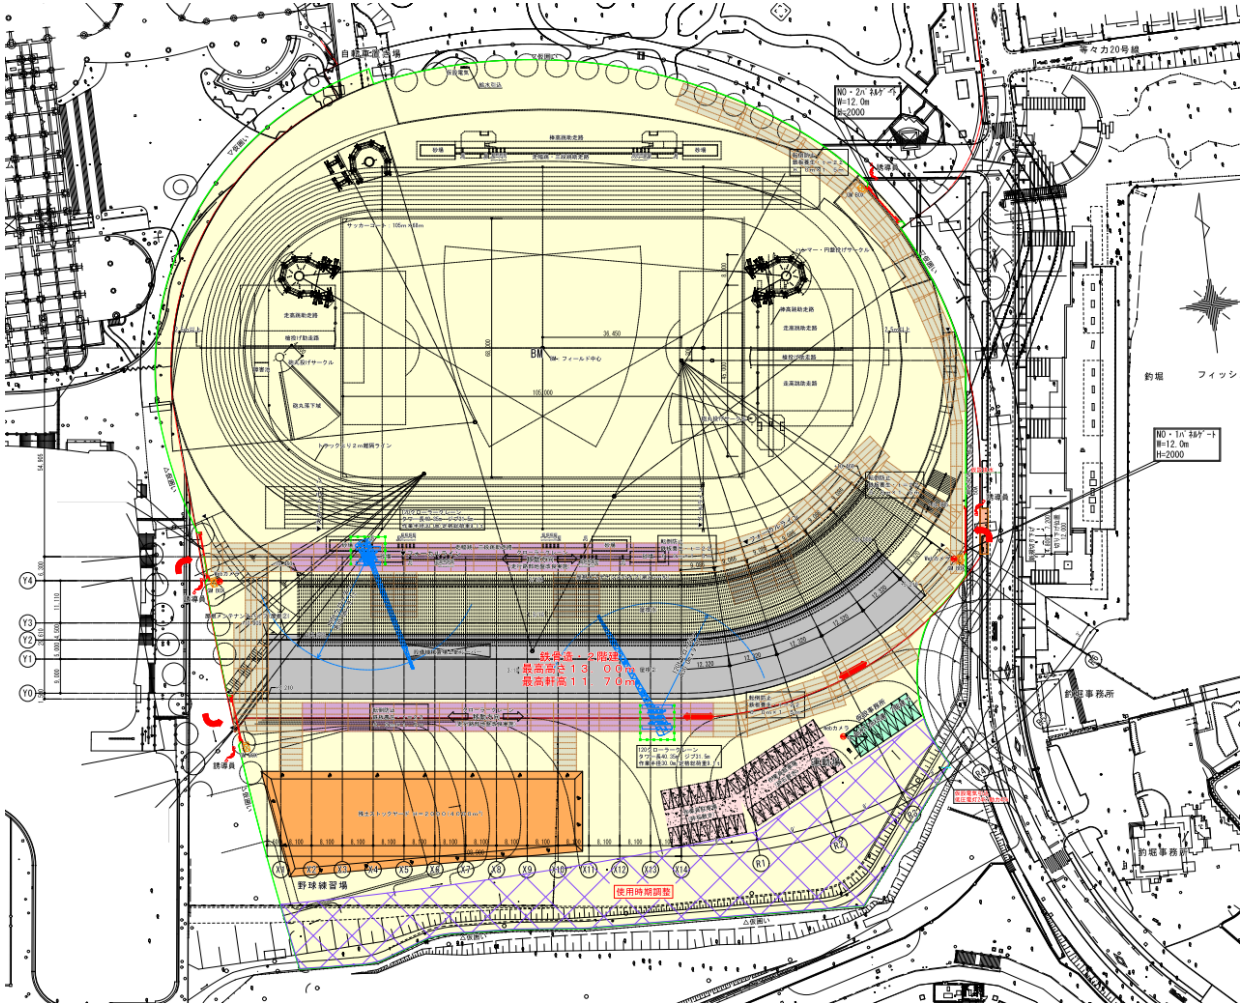

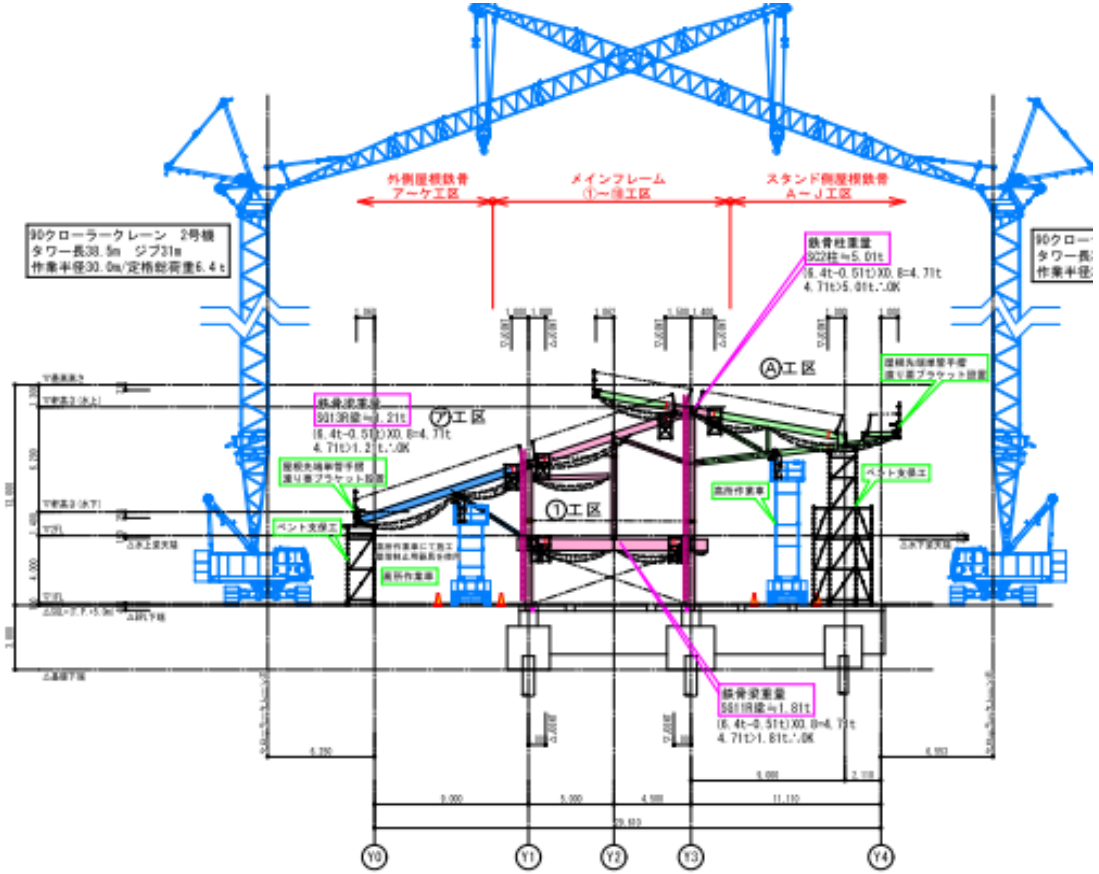

（新）等々力陸上競技場建設工事

④　自由提案施設建設工事（正面広場）


施　工　者　　株式会社大山組

工事概要

施　　工　　者	株式会社　大山組
整　備　施　設	自由提案施設建設工事（正面広場　３棟）
延　床　面　積	1-1a棟　451.86㎡、1-1ｂ棟　347.28㎡、 1-2棟　325.18㎡
構　　造	各棟　S造（地上1階）
整　備　期　間	2025年12月15日～2026年12月中旬（予定） ※テナント工事含む

株式会社 大山組

工事予定表

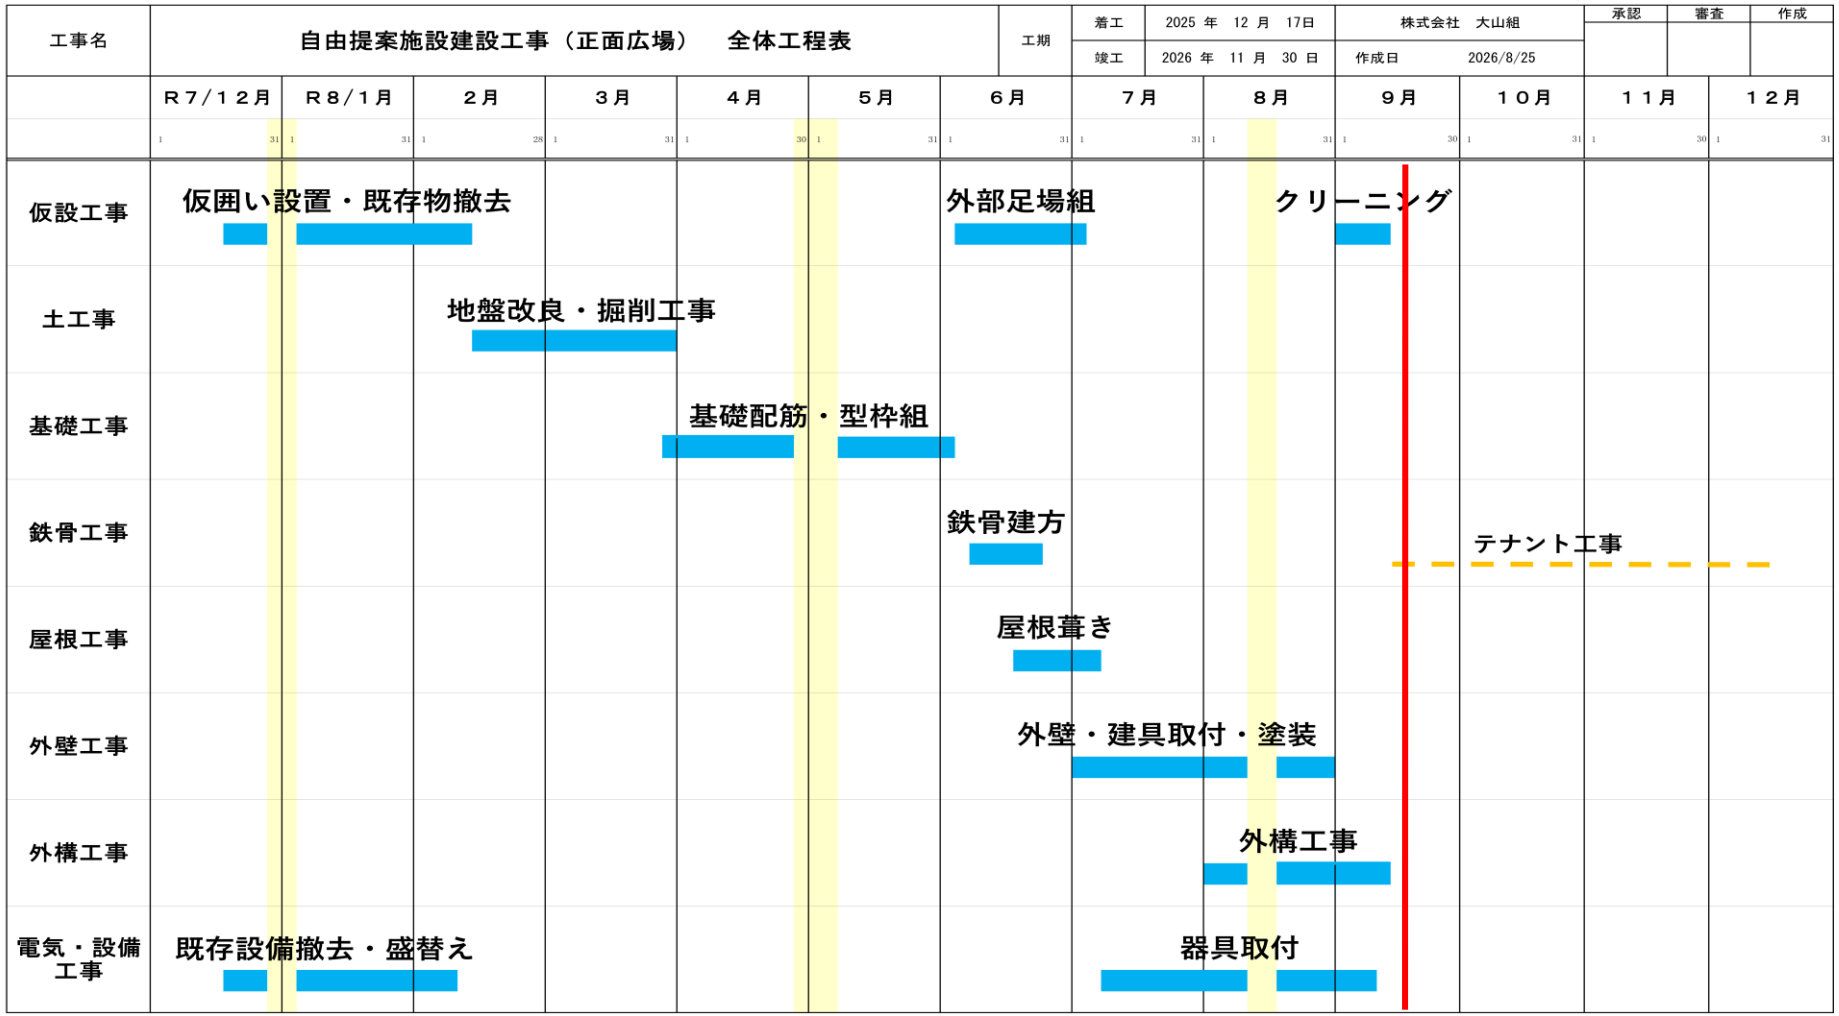

自由提案施設建設工事（正面広場）

株式会社 大山組

計画平面図



自由提案施設建設工事（正面広場）

株式会社 大山組

工事写真



6/9～7/3　鉄骨工事



6/17～7/20　屋根工事



7/10～7/30　外壁工事



7/30～8/17　建具工事



7/23～　塗装工事



7/28～　外構工事

自由提案施設建設工事（正面広場）

株式会社 大山組

今後の工事予定

今後の主な工事予定

９月中旬～テナント工事

１０月上旬～植栽工事



自由提案施設建設工事（正面広場）

株式会社 大山組

⑤　旧川崎市市民ミュージアム解体工事

施　工　者　　大成建設株式会社

工事概要

施　　工　　者	大成建設株式会社
建　物　名　称	旧川崎市市民ミュージアム
延　床　面　積	19,542.83㎡
構　　造	RC造（地階）・SRC造（地上1階・2階）・S造（地上3階）
階　　数	地下1階　地上3階　塔屋1階
解　体　工　期	2025年10月1日～2027年1月31日（予定）


TAISEI

配置図

【解体建屋】
旧川崎市市民ミュージアム



工事予定表

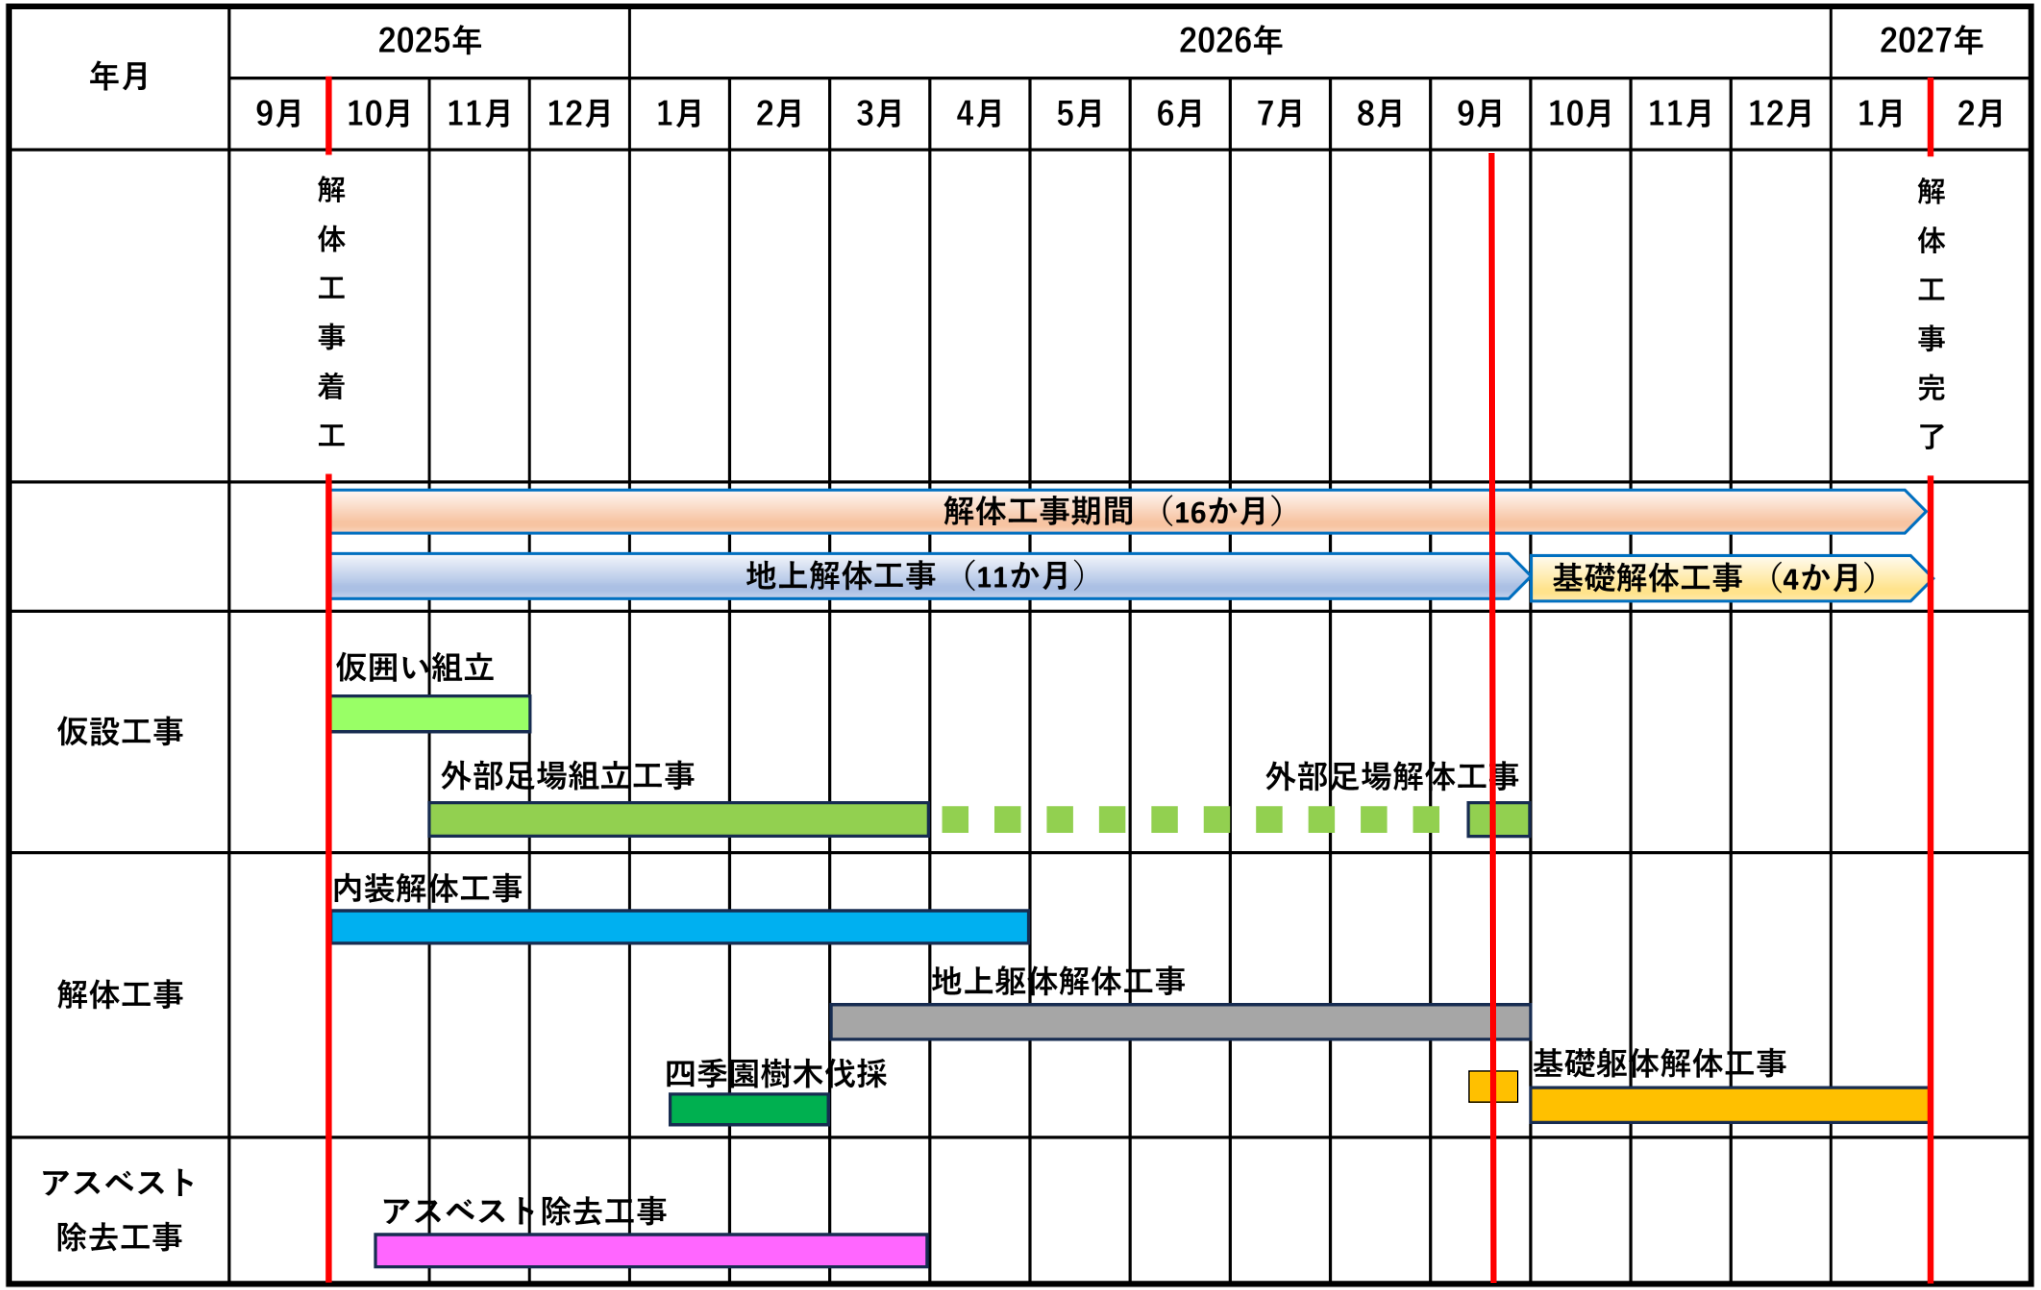
年月
2025年
2026年
2027年
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
解体工事着工
解体工事完了
解体工事期間 （16か月）
地上解体工事 （11か月）
基礎解体工事 （4か月）
仮設工事
仮囲い組立
外部足場組立工事
外部足場解体工事
解体工事
内装解体工事
地上躯体解体工事
四季園樹木伐採
基礎躯体解体工事
アスベスト除去工事
アスベスト除去工事

計画平面図


仮設事務所
作業員休憩所
作業員トイレ
喫煙所
アポロステーション
東京都市大総合運動場
等々力
ふるさとの森
解体
建屋
補助陸上競技場
とどろきアリーナ
等々力緑地
西丸子小
ジョリーパスタ
等々力球場
宮内中
マルダイ
【凡例】
：仮囲い・大成建設設置
（フラットパネル H=3m）
：工事車両出入りゲート
：工事車両動線
：作業員通行（調整中）
：喫煙所
：作業員トイレ

工事写真



8月中旬　全体状況



8月下旬　建屋解体状況



8月下旬　建屋解体状況



8月下旬　講堂エリア解体状況



8月下旬　外部足場解体状況(北側)




8月下旬　外部養生足場状況(南側)

TAISEI


今後の工事予定

・9月中旬まで　上屋解体工事
・9月中旬から　基礎躯体工事開始
（既存底盤解体・山留工事・基礎解体）


敷地北側
既存埋設インフラ撤去に伴い、歩道が狭くなる期間が発生します。

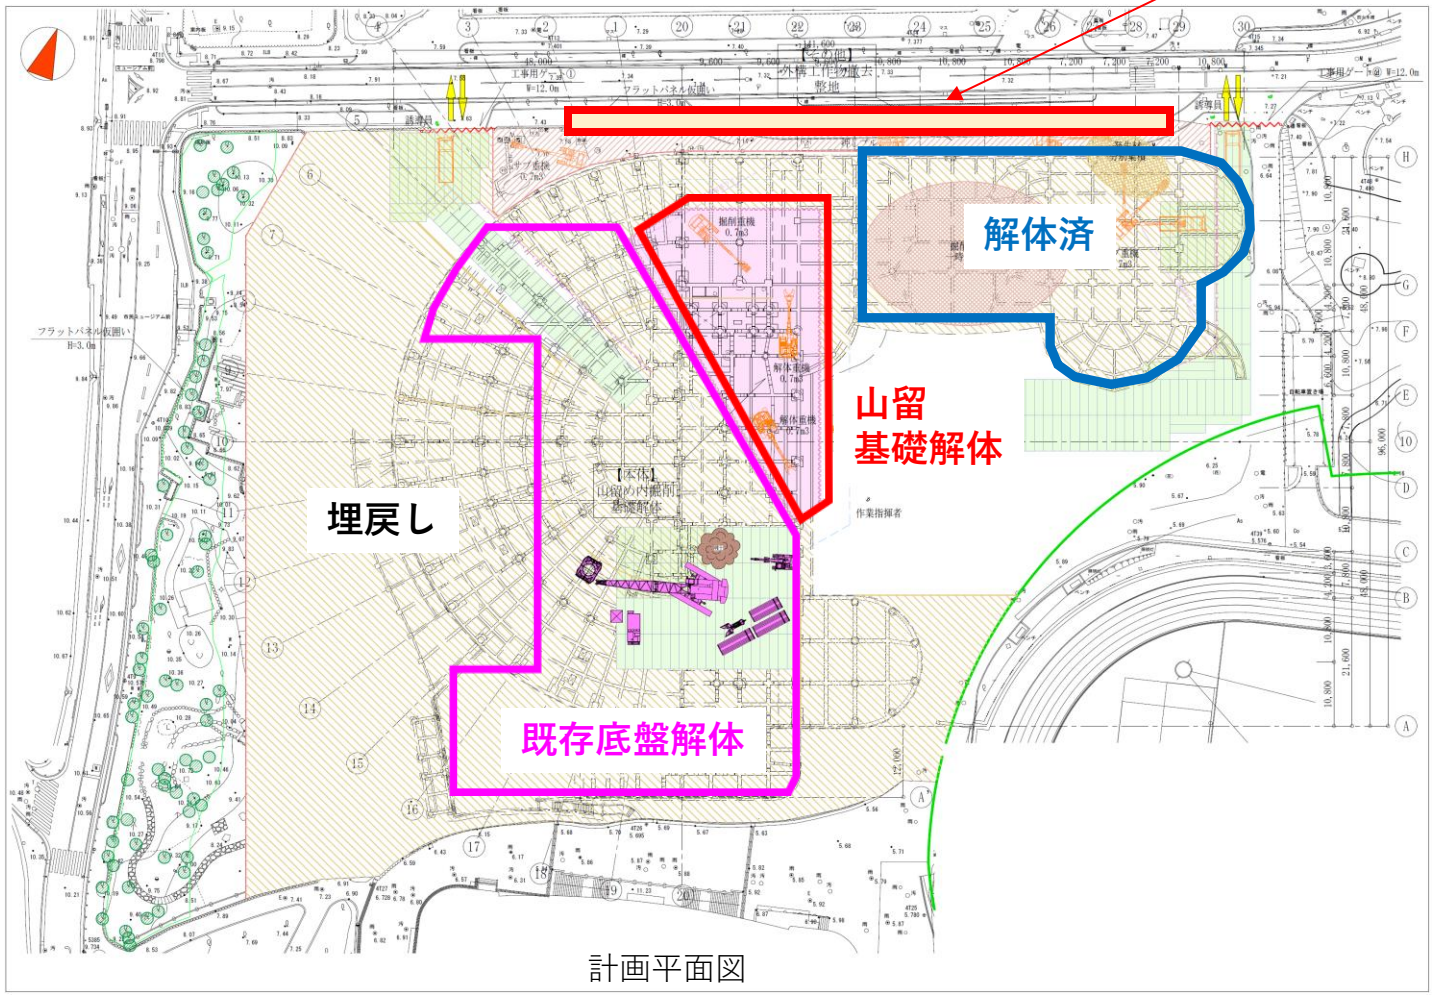

計画平面図

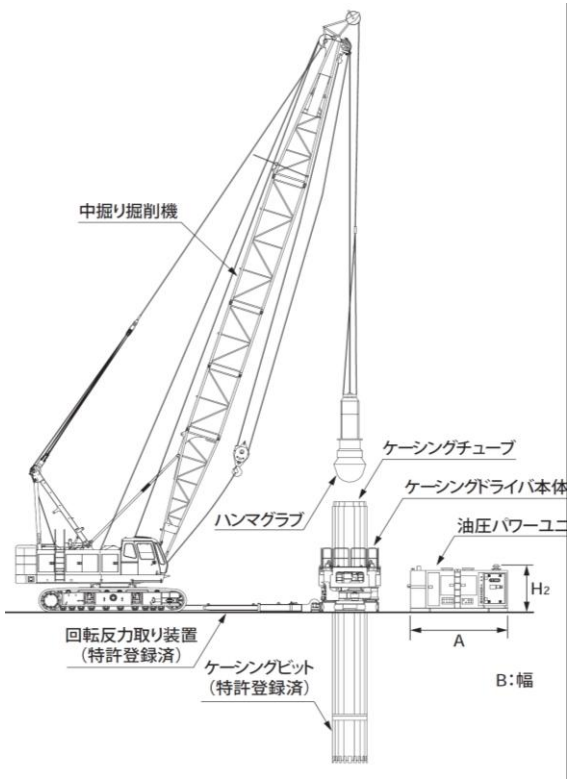

既存底盤解体機

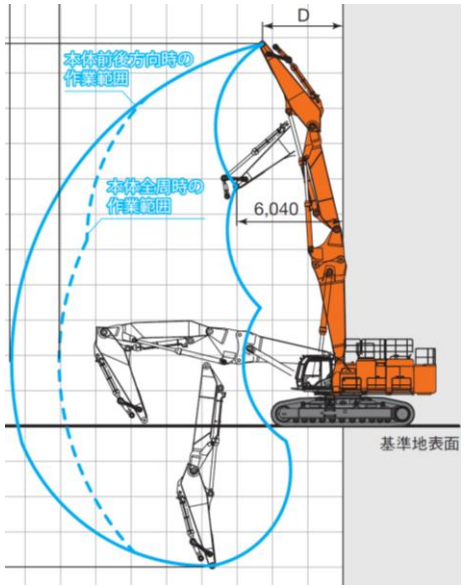

基礎躯体解体機

(例)解体重機

TAISEI


⑥　自由提案施設建設工事（球場西側）

施 工 者　　株式会社内藤ハウス

工事概要

施　　工　　者	株式会社　内藤ハウス
整　備　施　設	自由提案施設建設工事（等々力球場西側４棟）
延　床　面　積	2-1棟　999.08㎡、2-2棟　1937.28㎡、 3-1棟　999.55㎡、3-4棟　952.30㎡
構　　造	各棟　S造（地上1階）
整　備　期　間	2026年10月1日～2028年3月31日（予定） ※テナント工事含む


配置図

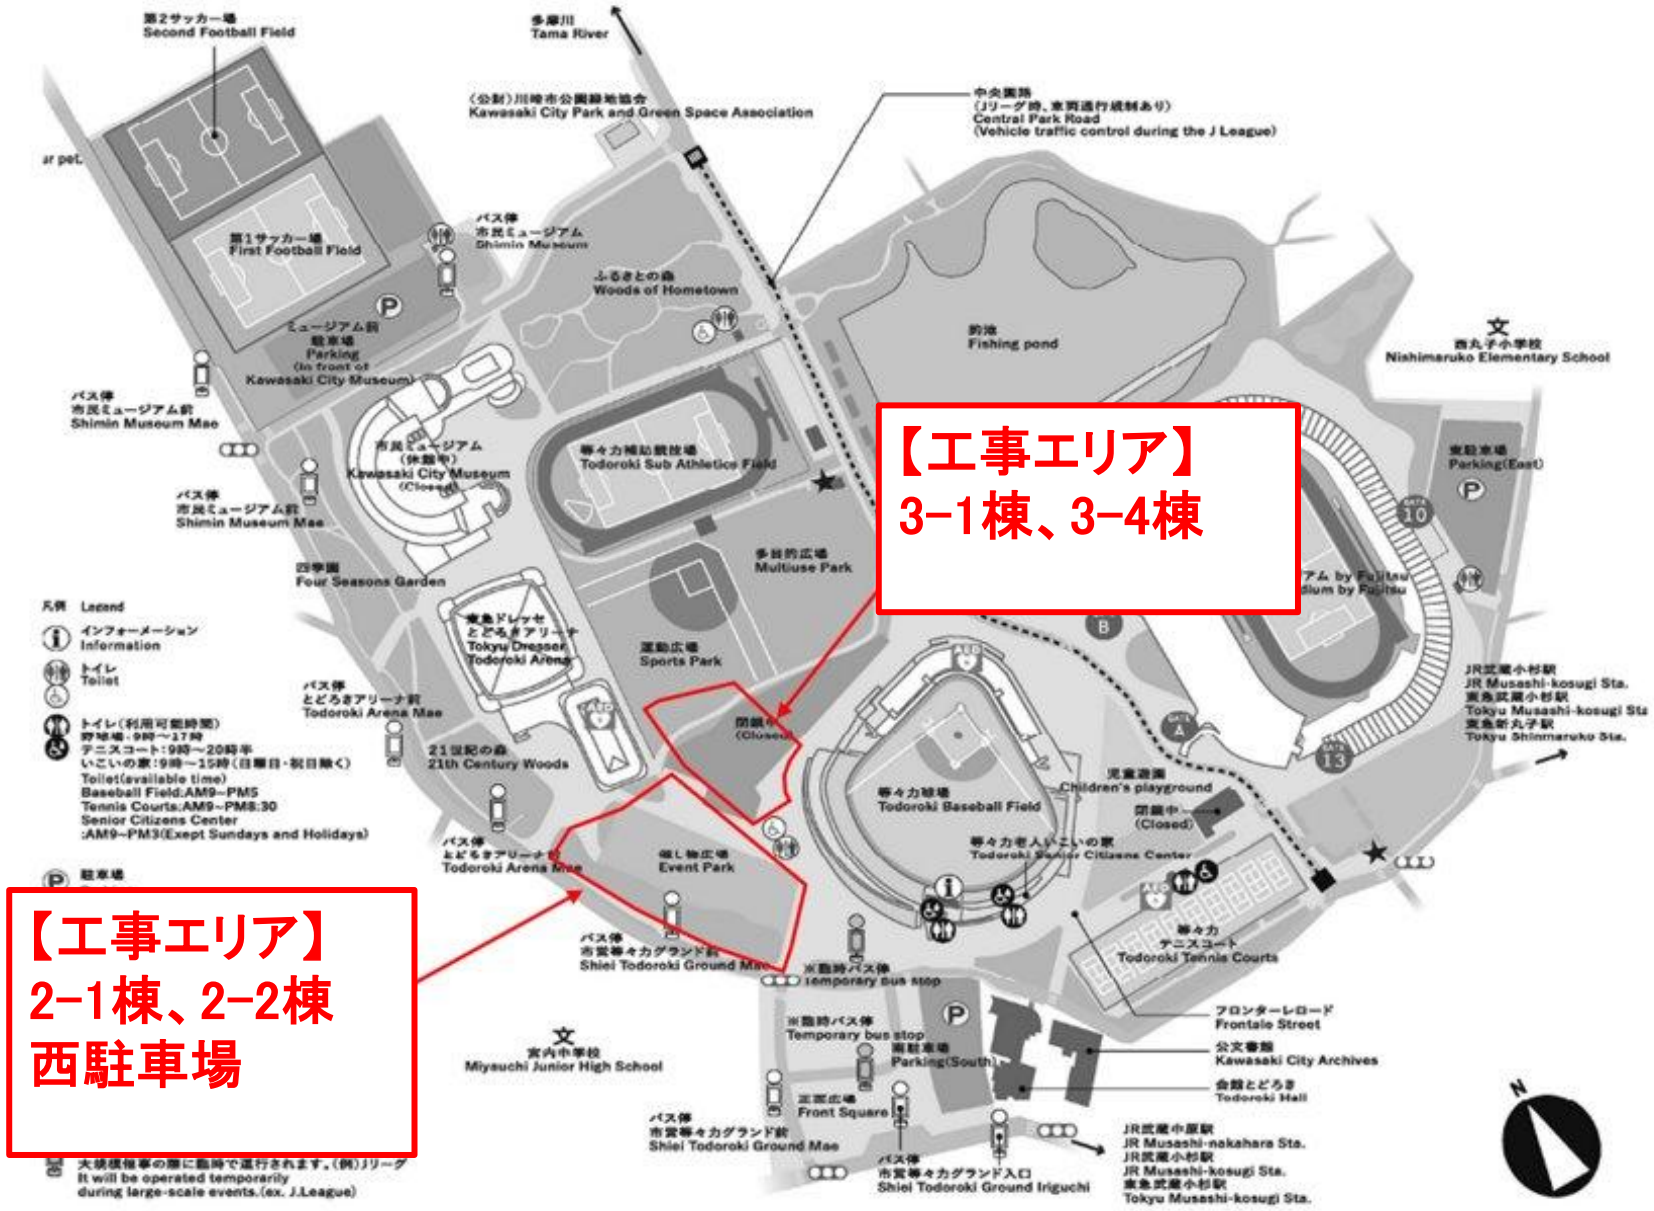

株式会社 内藤ハウス


工事予定表

工事名　　等々力緑地再編整備・運営等事業自由提案施設(等々力球場西側付近)

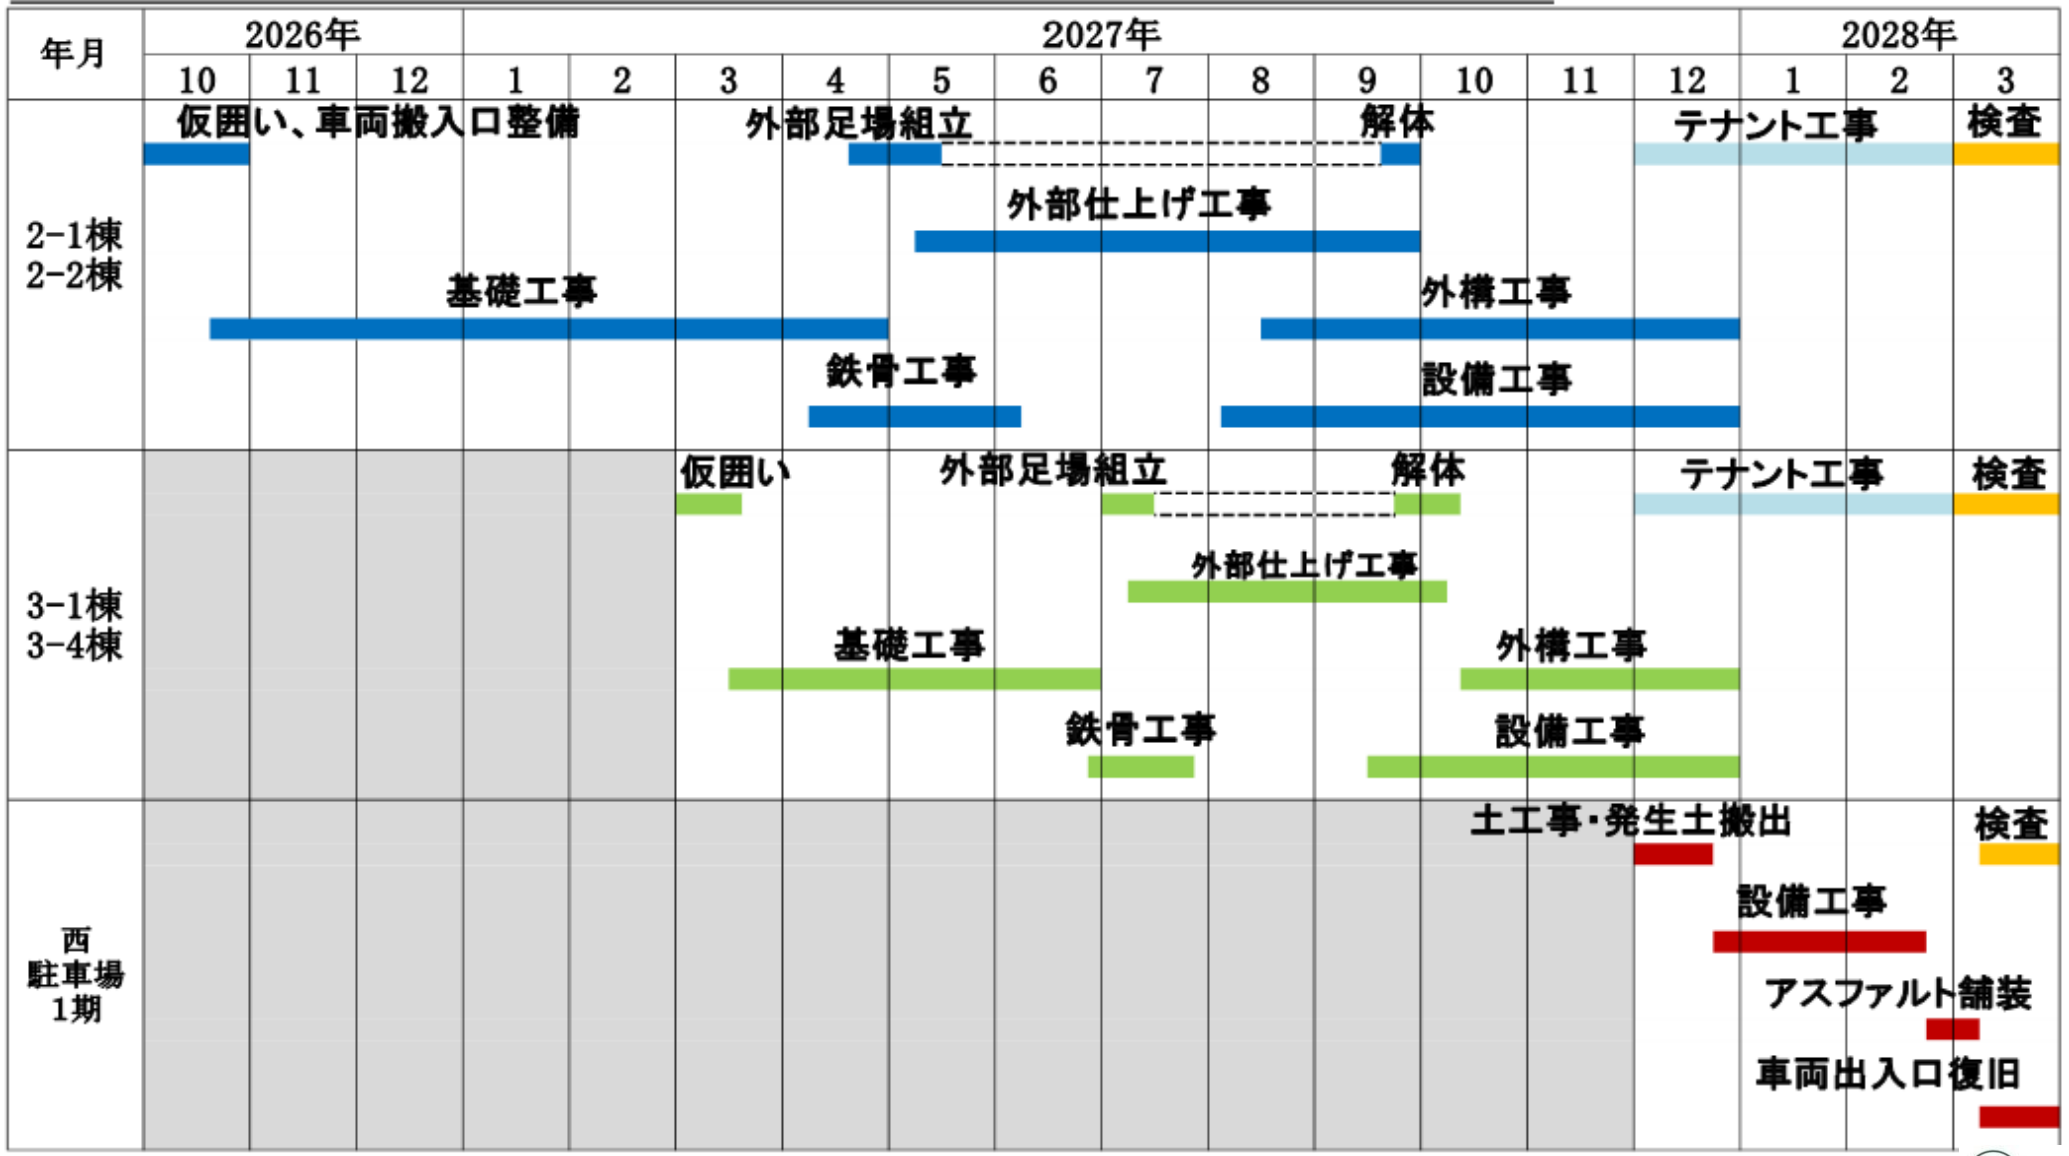

※　2029年度以降に西駐車場2期工事　を予定しております。

工事計画　平面図

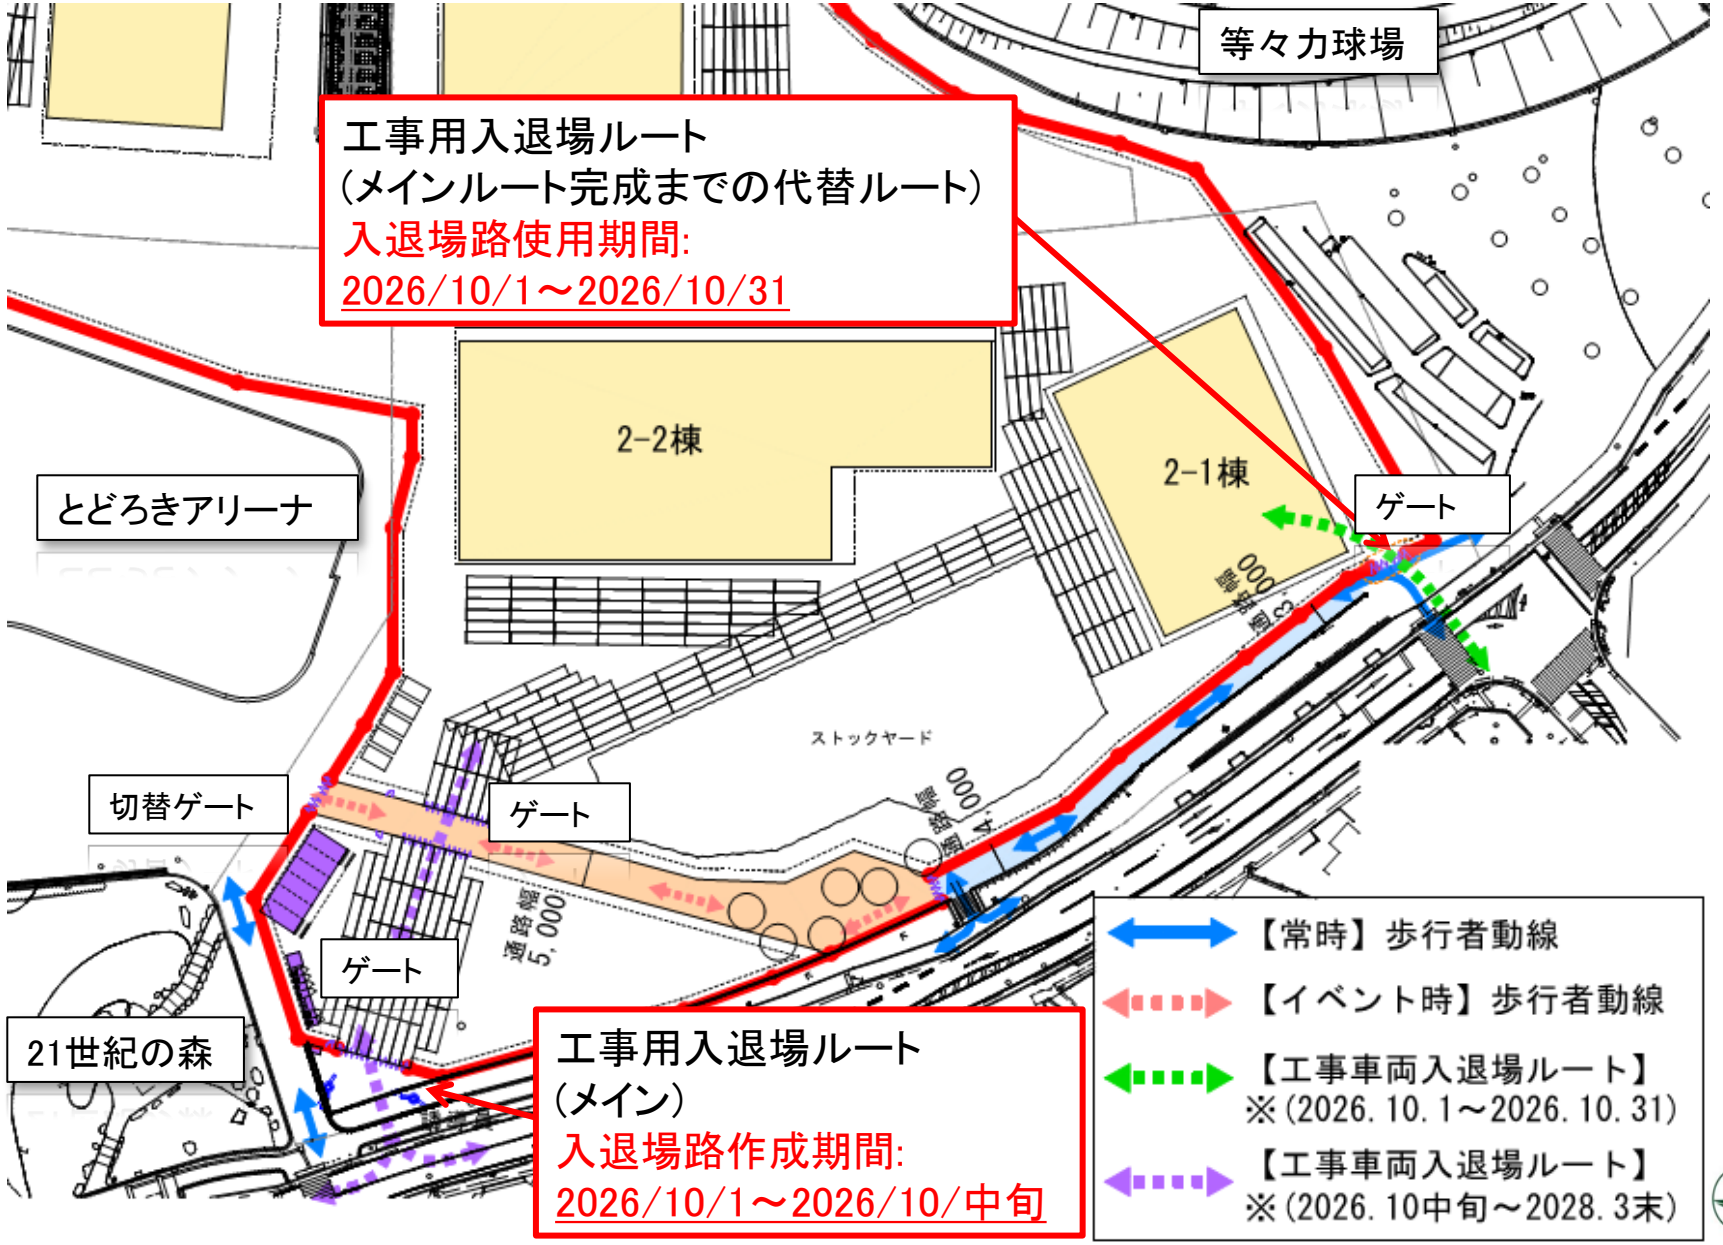

株式会社内藤ハウス

（参考）掲示物

注意




この先、自転車
通り抜けできません。
とどろきアリーナ側へは
前面道路をご通行ください。


催し物広場の迂回通行に関して

再編整備の工事進捗に伴い、催し物広場が１０月１日以降、通路範囲が変更となります。ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。

現状

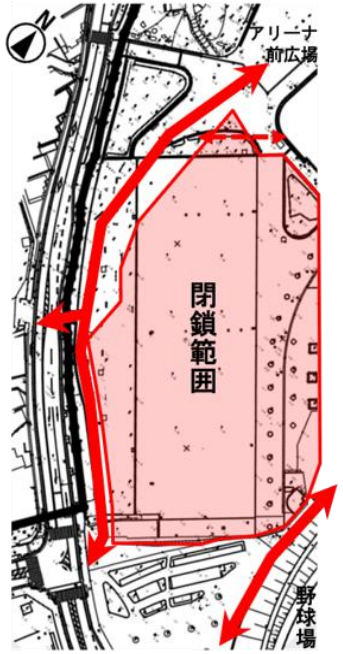

10月初旬～

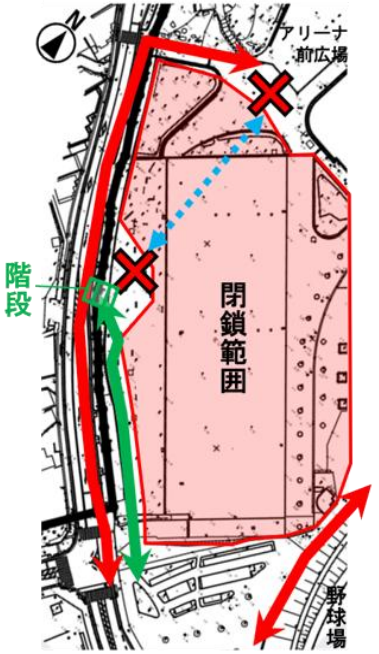

10月より通路が切り替わります。アリーナ前広場には園外の歩道にて迂回ください。園内通路は自転車では通り抜けできないのでご注意ください。大規模イベント実施時には、閉鎖範囲の一部を開放予定です。

- 新たに通行できなくなる経路
- 歩行者・自転車通行可能経路
- 歩行者のみ通行可能経路
- アリーナ大規模イベント開催時に開放予定

※イベント時開放する日程詳細は別途案内いたします。

株式会社 内藤ハウス

(参考)掲示物

歩道閉鎖、う回のお願い

9/24（木）～10/2（金）平日9時～17時

アリーナ出入口部の歩道を閉鎖するため、
緑地内通路か道路の反対側の歩道を
ご利用いただくようお願いいたします。

歩道閉鎖、う回のお願い

再編整備工事のため、一部歩道を閉鎖しますので、う回をお願いいたします。

日時：9/24(木)～10/2(金)平日9時～17時

土日祝日　夜間早朝は通常通りご通行いただけます。

ご不便をおかけいたしますが、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。



等々力緑地側の
歩道が閉鎖になりま
すので、園内の通路、
道路反対側(西側)の
歩道をう回いただき
ます

迂回経路

お問い合わせ先

東急建設株式会社　篠原携帯　070-3281-4232

川崎とどろきパーク(株)

仮囲い設置状況（参考イメージ写真）



(参考)タイヤ洗浄イメージ



（参考）週間工程掲示イメージ



特定建設作業にかかる勧告基準（法律）

◇特定建設作業の種類

騒音規制法	振動規制法
1. くい打機（もんけんを除く。）、くい抜機又はくい打くい抜機（圧入式くい打くい抜機を除く。）を使用する作業（くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。） 2. びょう打機を使用する作業 3. さく岩機（電動を含む）を使用する作業（＊） 4. 空気圧縮機（電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。）を使用する作業（さく岩機の動力として使用する作業を除く。） 5. コンクリートプラント（混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。）又はアスファルトプラント（混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。）を設けて行なう作業（モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行なう作業を除く。） 6. バックホウ（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。）を使用する作業 7. トラクターショベル（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。）を使用する作業 8. ブルドーザー（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。）を使用する作業	1. くい打機（もんけん及び圧入式くい打機を除く。）、くい抜機（油圧式くい抜機を除く。）又はくい打くい抜機（圧入式くい打くい抜機を除く。）を使用する作業 2. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 3. 舗装版破砕機を使用する作業（＊） 4. ブレーカー（手持式のものを除く。）を使用する作業（＊）

（＊）作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。

◇特定建設作業に伴って発生する騒音・振動の規制に関する基準

規制種別	区域の区分	騒音規制法	振動規制法
基準値	1号、2号	85デシベル以下	75デシベル以下
作業時間	1号	午後7時～午前7時の時間内でないこと	
	2号	午後10時～午前6時の時間内でないこと	
1日あたりの作業時間	1号	10時間／日を超えないこと	
	2号	14時間／日を超えないこと	
作業日数	1号、2号	連続6日を超えないこと	
作業日	1号、2号	日曜日その他の休日でないこと	

（注）基準値は特定建設作業場所の敷地境界線での値。

川崎市HPより (2021年11月30日)



参考写真

本工事では、騒音規制法、振動規制法に掛かる作業の予定はありませんが、基準値レベルを超えないことを目標に管理します。
騒音・振動測定器を工事エリア境界に設置します。

お問い合わせ先

ご質問等がございましたら、下記までご連絡ください。

（施工者）株式会社内藤ハウス　横浜支店

担 当 ：　飯嶋、小俣、榎本

連絡先：045-534-6540（平日9:00～17:00）

※工事着工まで。変更後の連絡先は掲示にてお知らせします。

（事業者）川崎とどろきパーク株式会社

連絡先：044-711-2522（平日9:00～17:00）

樹木、森に関する取り組み

等々力緑地再編整備・運営等事業　工事説明会

21世紀の森先行整備について

①現在の21世紀の森の課題


- 常緑樹が大きく成長、密集し森の中に**光が入りにくい**
- 下草や低木が育たない地面が見え、**雨で土が流れやすい**
- 湿気からのコケ･キノコ･腐朽増加による**樹木の育成不良**
- 森内が暗く見通しが悪く、**安全性が低下**
- **倒木や枝折れリスクが増加**



暗い園内



根元が空洞化している樹木

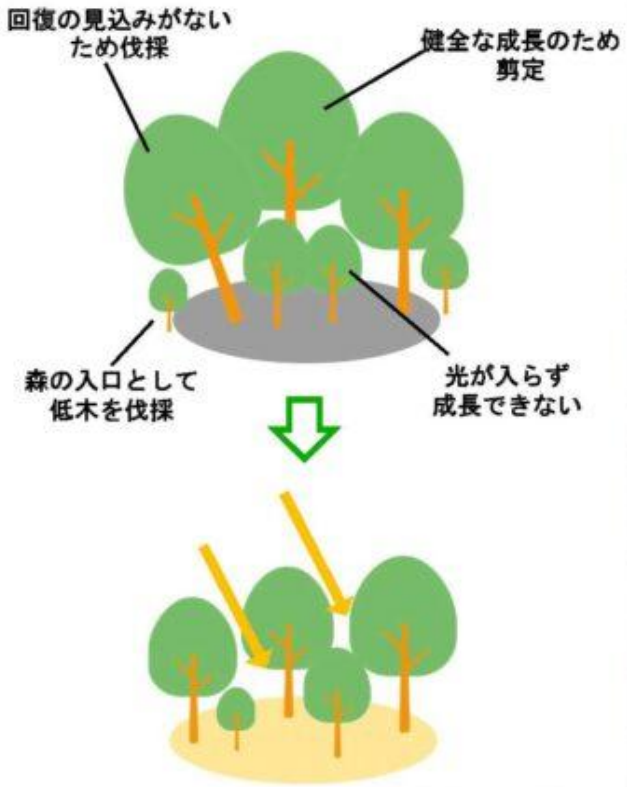

整備イメージ図



現状の航空写真(出展:Google Earth)

等々力緑地再編整備・運営等事業　工事説明会

新生２１世紀の森
10月使用開始予定

緑に関する
講演＆見学会を
今後実施予定

新生21世紀の森について

森ができてから年月が経ち、緑豊かな森となりましたが、木が密集し光や風が入りづらくなってしまいました。
この課題に対して、木の伐採・剪定、下草刈り、といった既存の森の保全に加えて、人・健康な緑・多様な生物が交わる「みどりの場」となることを目指します。

人が集う仕掛けづくり



1 円形広場
ひとりでもみんなでも使える居場所として配置します。



2 伐採木の活用
伐採した木を再利用し、人々が集う場所の一部として活用します。

生きものが集う仕掛けづくり



3 インセクトホテル
昆虫が巣を作ったり休息ができる生息環境をつくります。



4 バードバス
野鳥が水飲みや水浴びができる場所を新しく設置します。



5 バイオネスト
昆虫・土壌生物・菌が枝や落ち葉の中で活動し堆肥をつくります。



6 巣箱
鳥が安全に繁殖・生活ができる居場所をつくります。

森の仕掛けづくり



7 園路
通り抜け可能な園路を舗装で整備し、森への導入路をつくります。



8 明るい森
枝葉を整理し、光・風が通り抜ける明るい森をつくります。



工事中の取組

工事中の取り組み例

①6/8フジタ　近隣保育園参加イベント



②6/16大成建設　近隣保育園参加イベント



保育園の
みなさんから
絵をいただき
ました



工事中の取り組み例

③仮囲いプランター設置　６月より





④藤棚一部開放　時間帯延長　８月より



時間延長のご要望により
９時～１７時　→　８時～１７時に
変更しました

工事中の取り組み例

⑤施工者清掃活動開始　月１継続





ご清聴ありがとうございました
